

工程表

工事名: 立川基地跡地昭島地区柴崎分水路移設その他工事

アイサワ工業(株)


種別	細別	平成26年 12月																															備考	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
仮設工	再生砕石製造工																																	
	万能鋼板設置工																																	
排水工	重力式擁壁工																																	
移植工	大径木移植																																	
整地工	事務所用地整地																																	
備考																																		

11月19日 時点
進捗状況

排水工(防火水槽基礎)



排水工(開水路部完了)

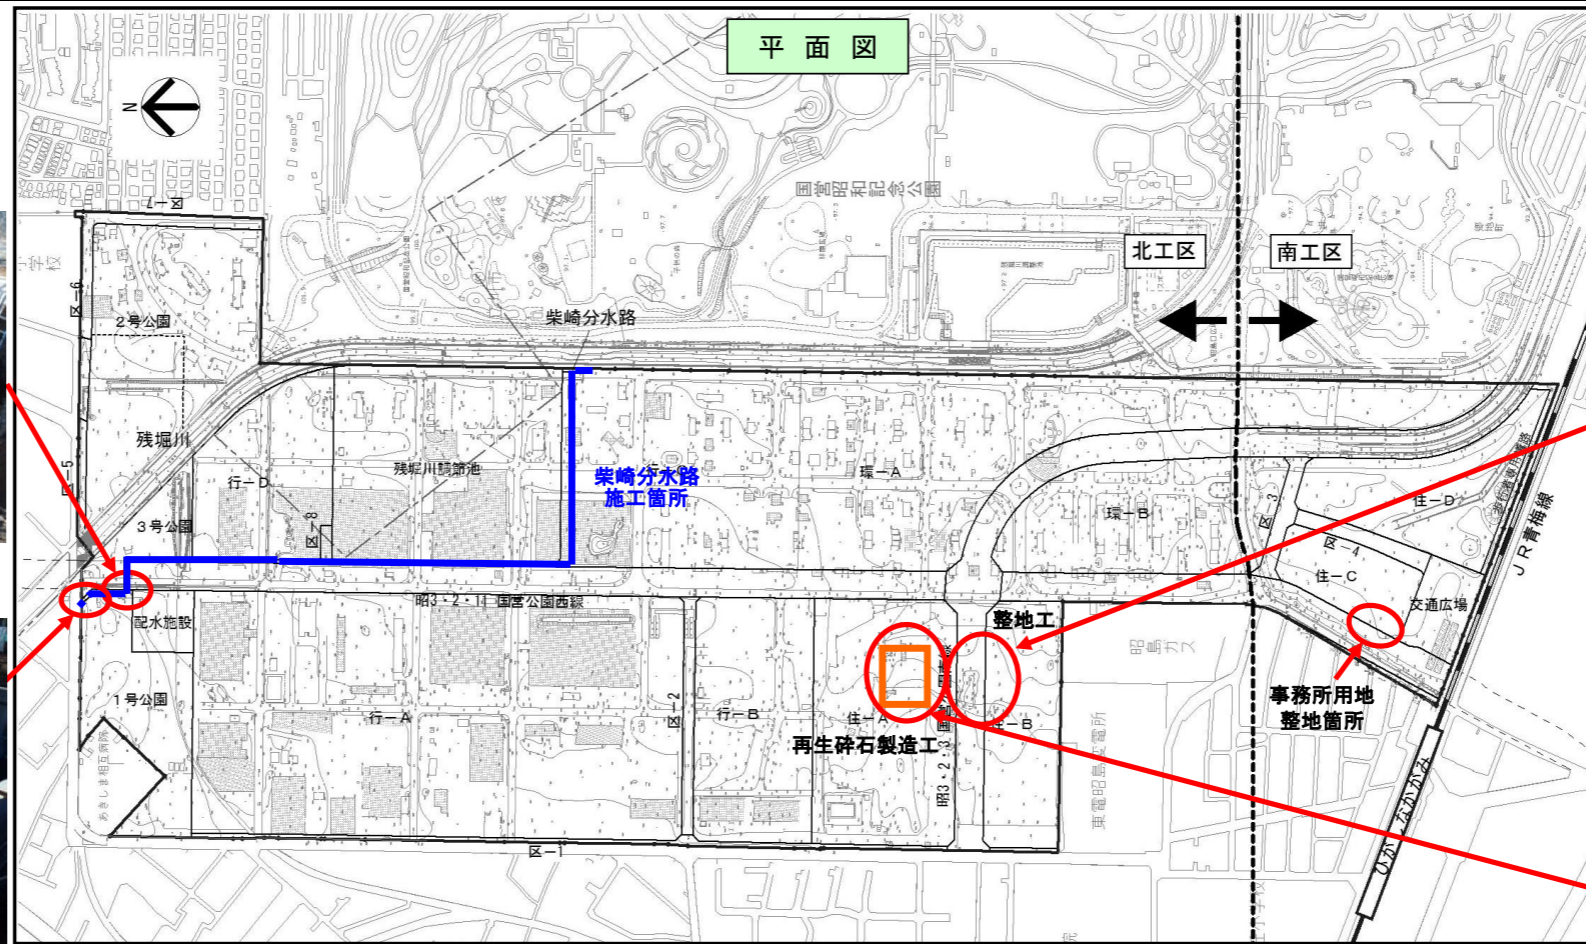

-凡例-
休工

整地工(道路部)



再生砕石製造工(集積状況)

