

# 工程表

工事名: 立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事他1件


鴻池・岩倉建設工事共同企業体

種別	細別	平成27年 6月																														備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
《北工区①区域》 準備工	地中探査																															
	鉄板敷設																															
撤去工	構造物撤去																															
排水工	雨水本管工																															
	汚水本管工																															
上水道工	水道施設工																															
《南工区》 準備工	地中探査																															
備考		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <span>休日</span> </div>																														



## 5月29日 時点 進捗状況

平面図

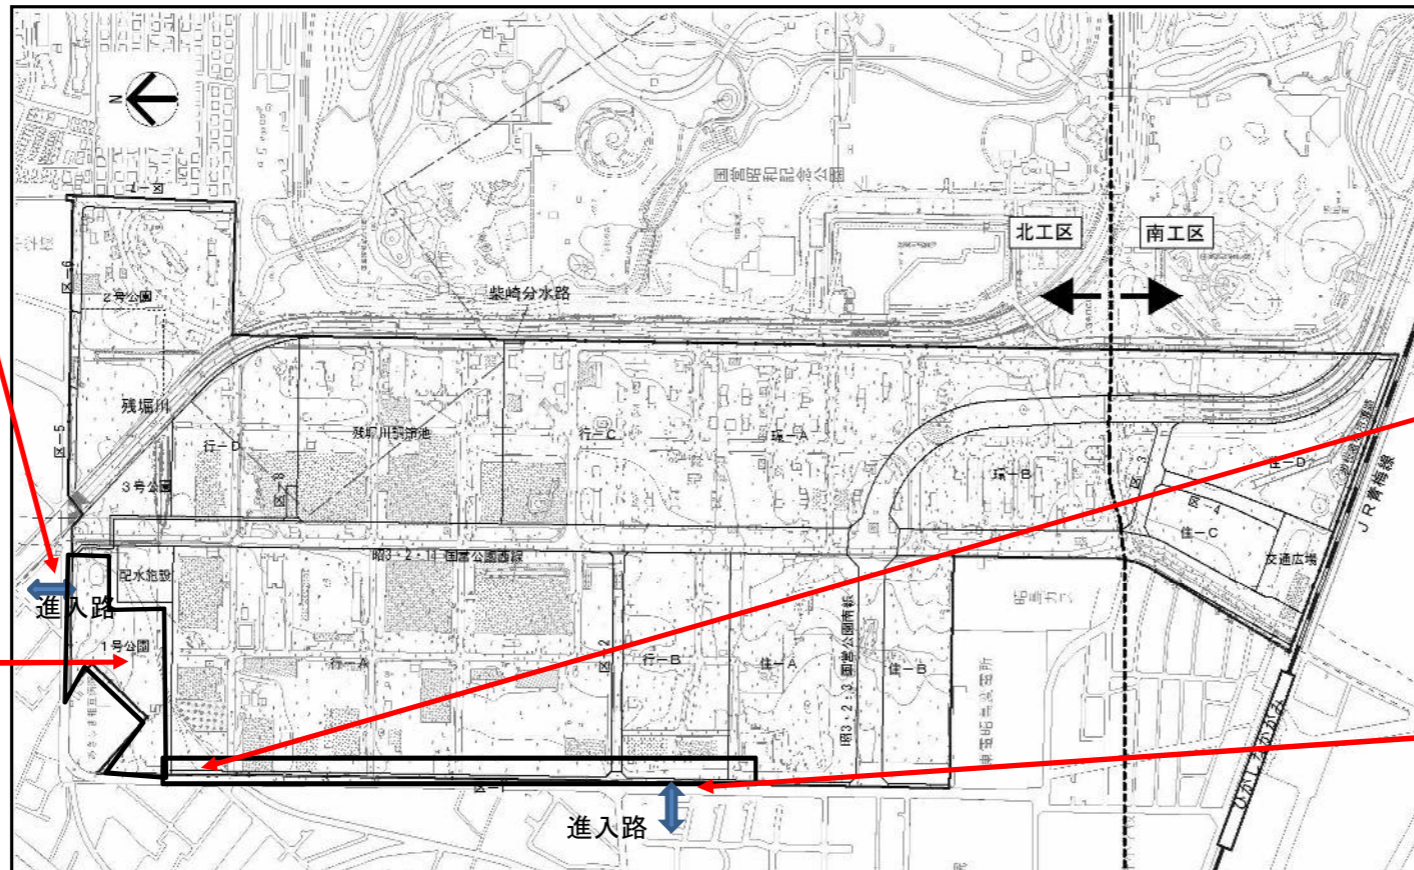

進入路付近(北側)



伐採工(伐採完了)



排水工事(掘削状況)



進入路付近(西側)

