


令和4年4月の工事案内

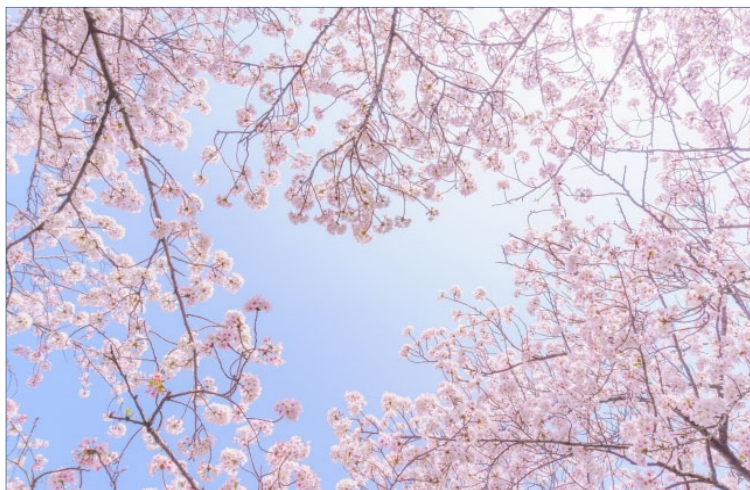

4月に入り桜も満開を迎え、過ごしやすい季節を迎えました。皆様いかがお過ごしでしょうか？

4月より12m道路既存部整備工事の他に、市道429号線と寄附道路①の道路工事の開始を予定しております。通行に支障が出ないよう留意いたしますが、ご迷惑をおかけする事もあるかと思ひます。ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

公園正面口のしだれ桜も少しですが花を咲かせました。これから年々立派になるのを楽しみたいと思ひます。

4月の主な工事

○【UR工区】

道路工事

◆ 12m道路:道路工・擁壁工

◆ 寄附道路①:道路工

基盤整備工事

◆ 市道429号線:道路築造工

○【民間工区】

◆ 宅地2:防災施設工

◆ 宅地1:整地工・防災排水工・階段工・逆T擁壁撤去工・擁壁工

工事区域全体



※3/24撮影


現場状況



八幡前二見台線道路工事完成しました

UR都市機構 鶴見一丁目地区 工事監督員事務所

令和4年5月の工事案内

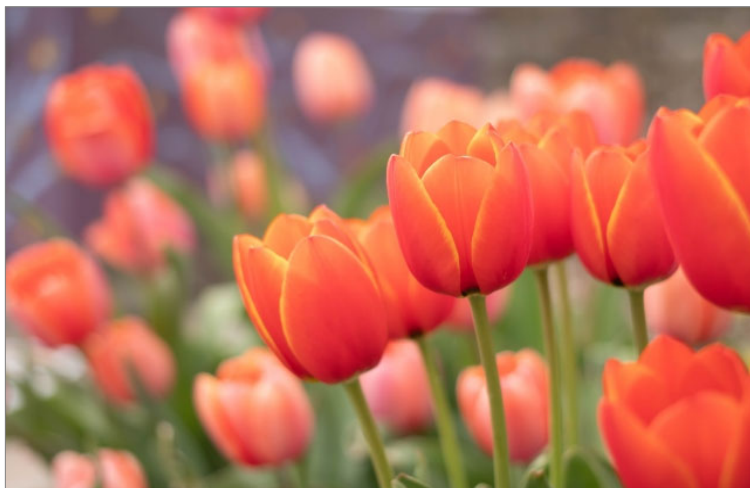

5月に入り木々の緑が色濃くなってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか？

引き続き12m道路既存部整備工事・市道429号線と寄附道路①の道路工事を施工しております。通行に支障が出ないよう留意いたしますが、ご迷惑をおかけする事もあるかと思ひます。ご理解・ご協力の程よろしくお願いしす。

5月の主な工事

○【UR工区】

道路工事

◆ 12m道路:道路工・擁壁工

◆ 寄附道路①:道路工・転落抑止柵設置工

基盤整備工事

◆ 市道429号線:道路築造工

○【民間工区】

◆ 宅地2:防災施設工

◆ 宅地1:整地工・防災排水工・階段工・逆T擁壁撤去工・擁壁工
スロープ工

工事区域全体



※4/27撮影

現場状況



〔擁壁工〕パンウォール工事順調に進んでいます

UR都市機構 鶴見一丁目地区 工事監督員事務所

令和4年6月の工事案内



今年は例年より早い梅雨入りし、雨の日が多くなりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか？

道路部分は12m道路既存部整備工事施工しております。跨線橋に繋がるスロープ部分の準備工事を開始します。皆様には迂回等ご迷惑をおかけする事もありますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

6月の主な工事

○【UR工区】

道路工事

◆ 12m道路:道路工・擁壁工

◆ 寄附道路①:道路工・水道工

基盤整備工事

◆ 市道429号線:防災排水工他

○【民間工区】

◆ 宅地2:整地工

◆ 宅地1:整地工・防災排水工・階段工・擁壁工・法面工・排水工
スロープ工

工事区域全体



※5/28撮影

現場状況



12m現道部(施工中)

UR都市機構 鶴見一丁目地区 工事監督員事務所

工事かわら版

◆ご近隣の皆様◆

UR都市機構 鶴見工事監督員事務所

令和 4年7月8日

7月の工事内容について

お知らせいたします。



【UR工区連絡先】

UR都市機構

鶴見一丁目地区 工事監督員事務所

連絡先 フリーダイヤル 0120-454-081

緊急時 080-1036-0238

【民間工区連絡先】

日本国土開発（株）工事監督員事務所

連絡先 電話 045-717-9802

緊急時 080-9044-6574

【スロープ工事連絡先】

大末建設(株)


(仮称)花月園駅前スロープ解体新設工事
作業所

連絡先 電話 045-633-4348

緊急時 080-3731-5416


7月の主な工事内容と範囲【UR工区】

道路その他工事	12m道路	道路工（路面排水工・雨水取付管工・舗装工） 整地工（防災施設工）
	寄付道路①	道路工（舗装工）

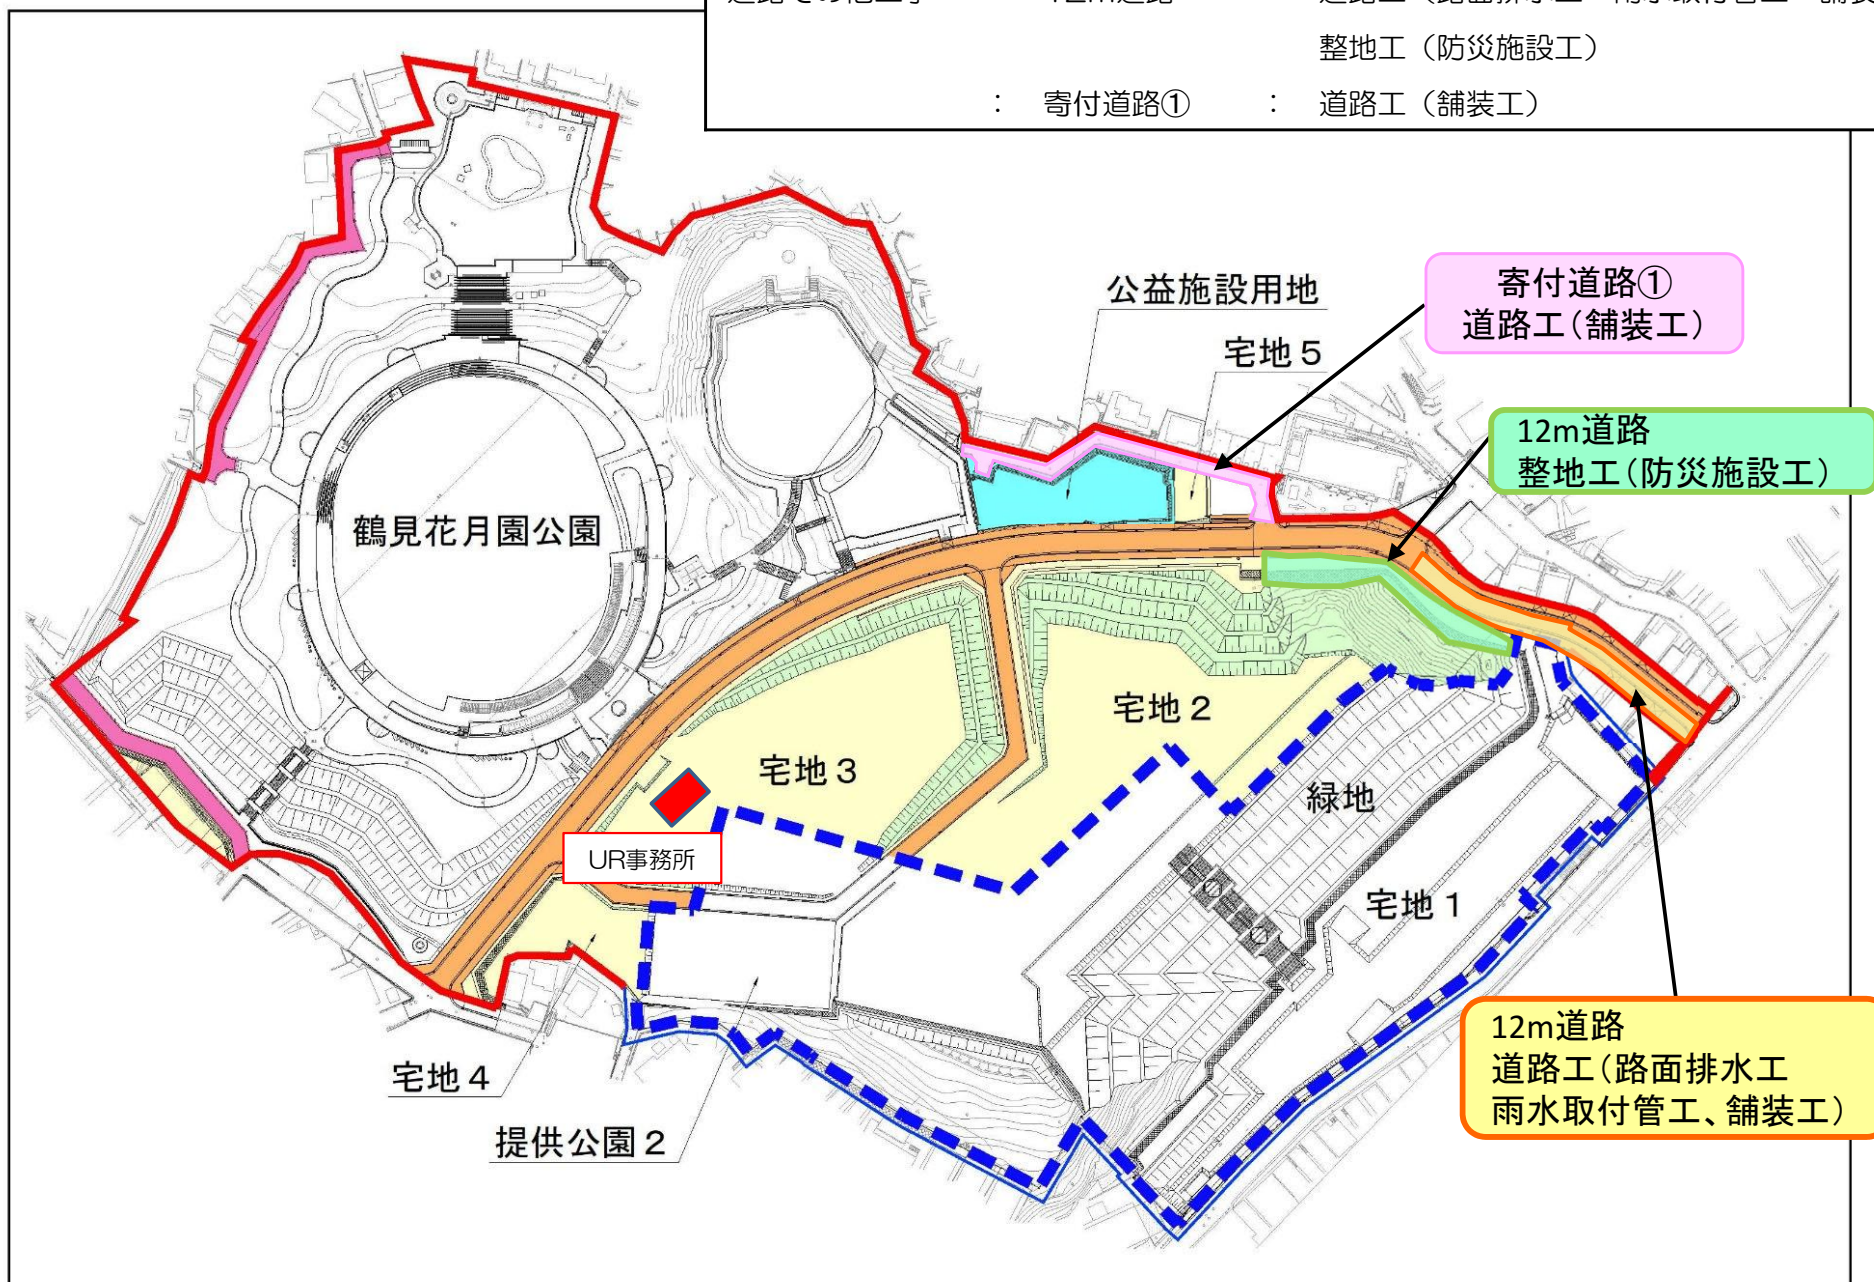

7月の主な工事内容と範囲【民間工区】

整地工事	宅地1・2	切土・土砂運搬
	宅地1	法面整形
防災排水工事	宅地1	小段排水・縦排水
	宅地2	U字溝据付
階段工事(プロムナード)	宅地1	擁壁・階段・植樹桝・手摺基礎
擁壁工事	宅地1	ブロック積擁壁
排水工事	宅地1	雨水サービス管
スロープ工事	宅地1	山留・橋台撤去

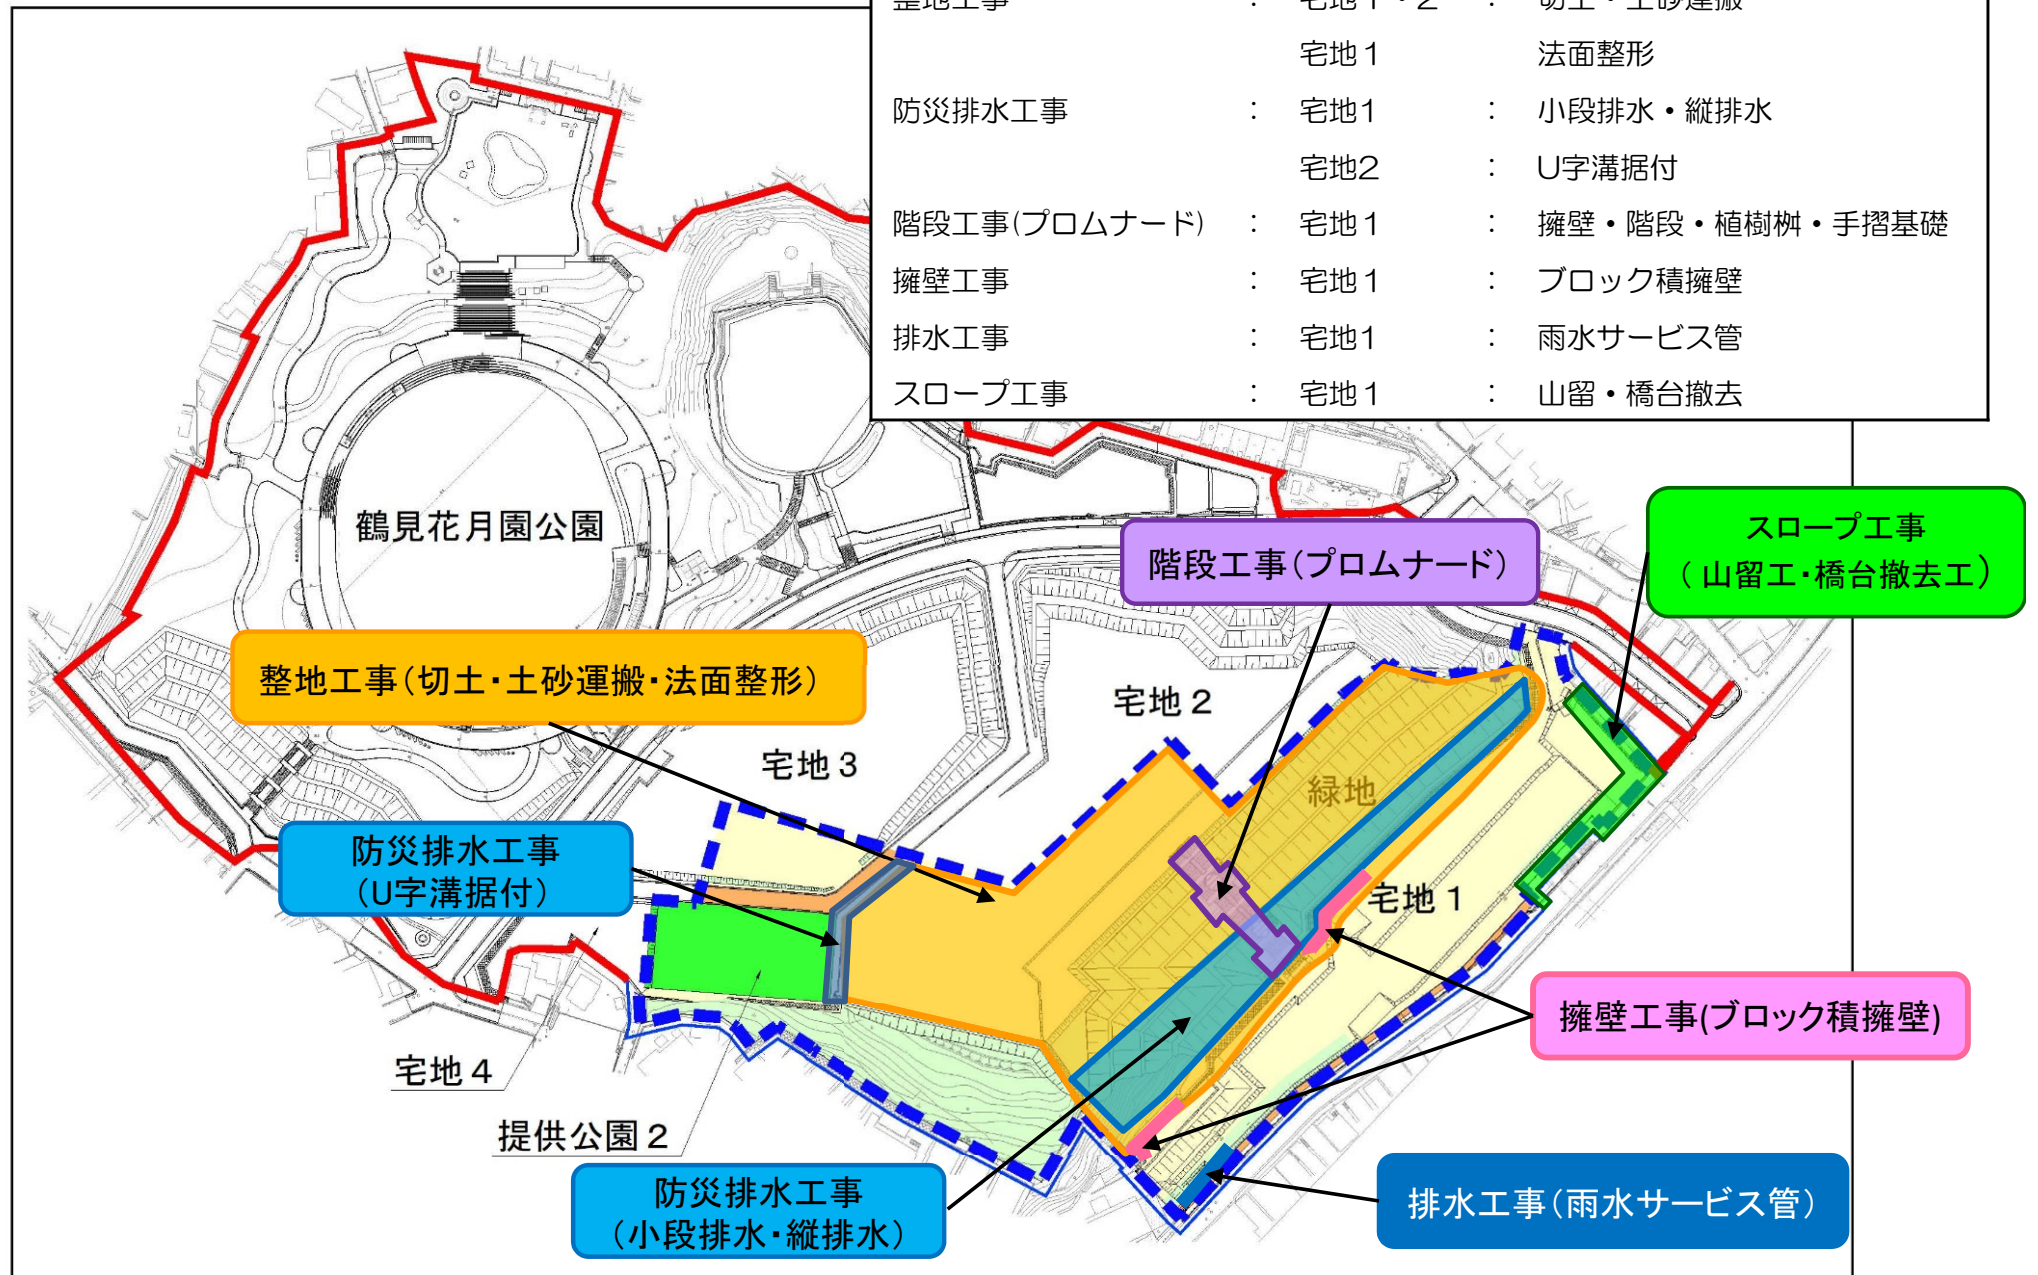

※ 下図のように旧花月園競輪場跡地の工事を行っております。

上空から撮影した現場状況

※R4.6.29撮影



現場の対策



○騒音・振動を抑えるために

騒音・振動が大きくならないよう、
低速な重機走行、慎重な重機作業を徹底します。
作業を行う近隣の方々には、事前に個別説明や工事案内の配布を行い、
騒音振動が大きくなる工事内容・時間帯をお知らせします。

○粉じんの飛散を防ぐために


工事車両走行路の清掃、場内の散水を行います。
草木が生えていない斜面には必要に応じ順次シートをかけていきます。

○大雨による泥水流出を防止するため設置した防災施設の維持管理

台風大雨対策として増設した防災施設の維持管理を行い、土砂流出防止
に努めます。小堤、土のう、沈砂池の点検管理及び必要に応じ増設を行います。



令和4年8月の工事案内

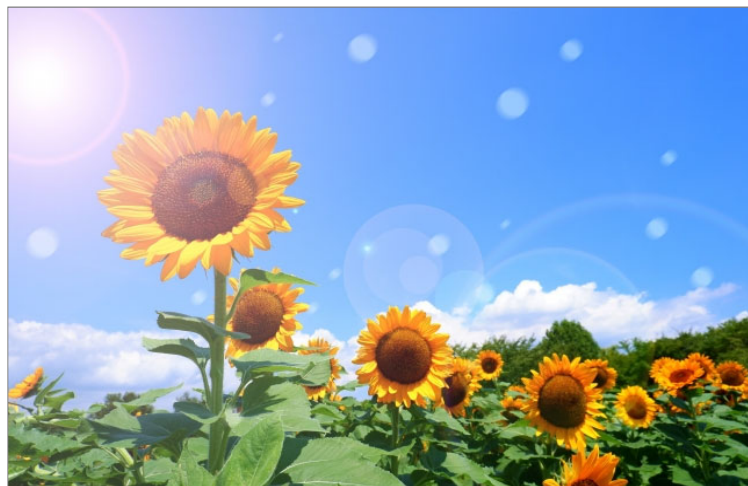

暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？

現場では引き続き、12m道路既存部整備工事及び整地・スロープ部解体工事を継続しております。皆様には通行止め、迂回等ご迷惑をおかけしますがご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

熱中症には、くれぐれもお気を付けください。

8月の主な工事

○【UR工区】

道路工事

◆ 12m道路:道路工・整地工

◆ 東側道路:道路工

○【民間工区】

◆ 宅地2:整地工・防災排水工

◆ 宅地1:整地工・防災排水工・階段工
・擁壁工・排水工・スロープ工

夏季休暇のお知らせ

【UR工区】

佐田建設(株) 8/11～8/17

【民間工区】

日本国土開発(株)8/14～17

大末建設(株) 8/11～15

※休工中は巡回点検を行います

工事区域全体



※7/25撮影

現場状況



12m既存道路部

UR都市機構 鶴見一丁目地区 工事監督員事務所

令和4年9月の工事案内



9月に入り暑さが収まりようやく過ごしやすい日が多くなりました。皆様いかがお過ごしでしょうか？

現場では引き続き、12m道路既存部整備工事(施工エリアが変わりました)及び整地・スロープ部解体工事を継続しております。皆様には通行止め、迂回等ご迷惑をおかけしますがご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

9月の主な工事

○【UR工区】

道路工事

◆ 12m道路:道路工・整地工・造園工

◆ 東側道路:道路工

○【民間工区】

◆ 宅地2:防災排水工

◆ 宅地1:整地工・防災排水工・階段工

・擁壁工・排水工・法面工・スロープ工

工事区域全体



※8/27撮影

現場状況



12m既存道路部 パンウォール前車道舗装

UR都市機構 鶴見一丁目地区 工事監督員事務所

令和4年10月の工事案内



10月に入りようやく過ごしやすくなりました。皆様いかがお過ごしでしょうか？

10/24AM10:00(予定)より公園への歩道通行が変更され、アクセスしやすくなります。引継ぎ12m道路既存部整備工事及び整地・スロープ部工事も継続しております。今後ともご協力の程よろしくお願いいたします。

10月の主な工事

○【UR工区】

道路工事

- ◆ 12m道路:道路工・整地工・造園工
- ◆ 東側道路:道路工
- ◆ バス通り:道路工

○【民間工区】

- ◆ 宅地2:防災排水工
- ◆ 宅地1:整地工・防災排水工・擁壁工・排水工・法面工・スロープ工



工事区域全体



※9/30撮影

現場状況



12m既存道路部 保育園前歩道整備しています

UR都市機構 鶴見一丁目地区 工事監督員事務所

令和4年11月の工事案内



11月に入り秋が深まり、公園の木々がきれいに紅葉してきました。皆様いかがお過ごしでしょうか？

12m道路既存部整備工事は、歩道・車道ともに整備が進んでいます。ほか、整地・スロープ部工事も継続しております。今後ともご協力の程よろしくお願いいたします。

寒くなって参りましたので、どうぞお身体ご自愛ください。

11月の主な工事

○【UR工区】

道路工事

◆ 12m道路:道路工・整地工

◆ バス通り:道路工

○【民間工区】

◆ 宅地2:防災排水工

◆ 宅地1:道路工・擁壁工・排水工・スロープ工

工事区域全体



※10/26撮影

現場状況



12m既存道路部 歩車道整備が進んでいます

UR都市機構 鶴見一丁目地区 工事監督員事務所

令和4年12月の工事案内



今年も残すところ、数週間になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか？

12m道路既存部整備工事は、歩道・車道ともに整備が進んでいます。ほか、整地・スロープ部工事も継続しております。今後ともご協力の程よろしくお願いいたします。

今年も1年間大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

12月の主な工事

○【UR工区】

道路工事

- ◆ 12m道路:道路工・整地工
- ◆ バス通り:道路工

○【民間工区】

- ◆ 宅地2:防災排水工
- ◆ 宅地1:道路工・法面工・排水工
:スロープ工

年末年始工事休工のお知らせ

下記の日程で、工事をお休みします

【UR工区】

- ◆道路工事 (佐田建設(株)施工)
R4.12/30~R5.1.5

【民間工区】

- ◆整地等工事(日本国土開発(株)施工)
R4.12/29~R5.1/4
 - ◆スロープ工事(大末建設(株)施工)
R4.12/29~R5.1/4
- ※休工期間中は巡回点検を実施します

工事区域全体



※11/25撮影

現場状況



12m既存道路部 歩車道整備が進んでいます

UR都市機構 鶴見一丁目地区 工事監督員事務所

令和5年1月の工事案内



新しい年を迎え、皆様いかがお過ごしでしょうか？昨年末に、12m道路既存部の舗装工事も完了いたしました。近隣の皆様には通行止め等、ご協力ありがとうございました。残りの部分も順次進めて参ります。

本年も各現場、安全第一で工事を進めて参りますのでどうぞよろしくお願いいたします。

1月の主な工事

○【UR工区】

道路工事

- ◆ 12m道路：道路工
- ◆ 宅地3・4・5：宅地整備工

○【民間工区】

- ◆ 宅地2：防災排水工
- ◆ 宅地1：道路工・法面工・排水工
：スロープ工

工事区域全体



※R4.12/20撮影

現場状況



センター保育園までの歩・車道舗装完了しました

UR都市機構 鶴見一丁目地区 工事監督員事務所

令和5年2月の工事案内



寒い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？

おかげさまで、12m道路既存部工事も最終段階を迎えました。通行規制等ご迷惑をおかけしております。その他部分も安全第一で進めております。ご協力・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

2月の主な工事

○【UR工区】

道路工事

- ◆ 12m道路:道路工
- ◆ 寄附道路③:道路整備工
- ◆ 宅地3・5:宅地整備工

○【民間工区】

- ◆ 宅地2:防災排水工
- ◆ 宅地1:道路工・法面工・排水工・防災排水工
:スロープ工

工事区域全体



※R5.1.28撮影

現場状況



12m道路既存部 区画線が入りました

UR都市機構 鶴見一丁目地区 工事監督員事務所

令和5年3月の工事案内



3月に入り少し春めいてまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？

おかげさまで、12m道路既存部工事も終了しました。近隣の皆様には通行規制等大変ご迷惑をおかけしました。

その他工事も、最終段階を迎えています。安全第一で工事を進めておりますので、ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。

3月の主な工事

○【UR工区】

道路工事

- ◆ 12m・6m道路：道路工
- ◆ 寄附道路③：道路整備工
- ◆ 宅地3・5：宅地整備工

○【民間工区】

- ◆ 宅地1：道路工・法面工・排水工・防災排水工
：スロープ工

工事区域全体



※R5.2.26撮影

現場状況



12m道路既存部 舗装工事終わりました

UR都市機構 鶴見一丁目地区 工事監督員事務所
