

工程表


工事名:立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事

鴻池・岩倉建設工事共同企業体

工事名:立川基地跡地昭島地区2号公園他整備工事(現場だよりはこちら→ <http://www.seibu-la.co.jp/tachikawaakishima/blog/>)

西武造園株式会社

種別	細別	平成29年3月																															備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
園路広場整備工	インターロッキング舗装、アスファルト舗装				●	●																											
敷地造成工					●	●																											
植栽工	低木・地被類・張芝				●	●																											
電気・給水設備工					●	●																											
仕上げ・片付け																																	
道路工事	道路施設工				●	●																											
道路工事	道路施設工				●	●																											
備考		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 休工日 </div>																															

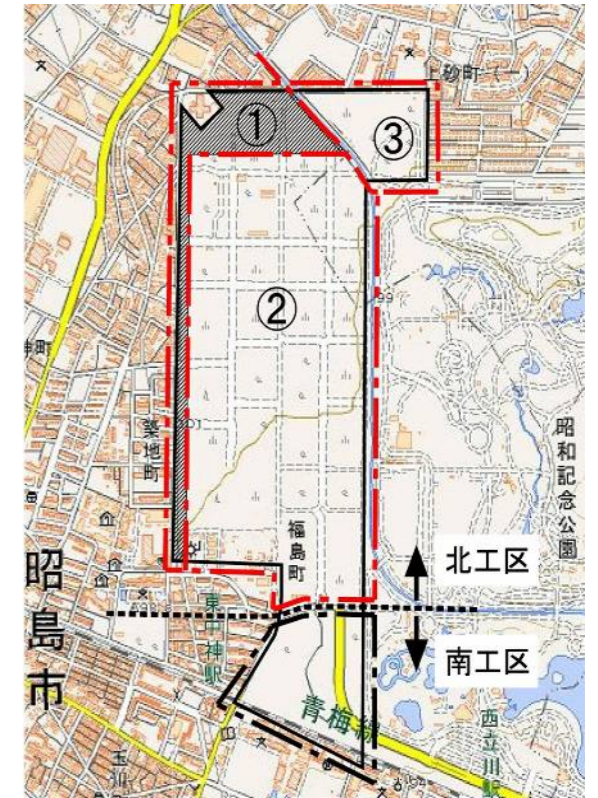


2月25日時点 進捗状況

ブロック舗装等(完了)



舗装(完了)

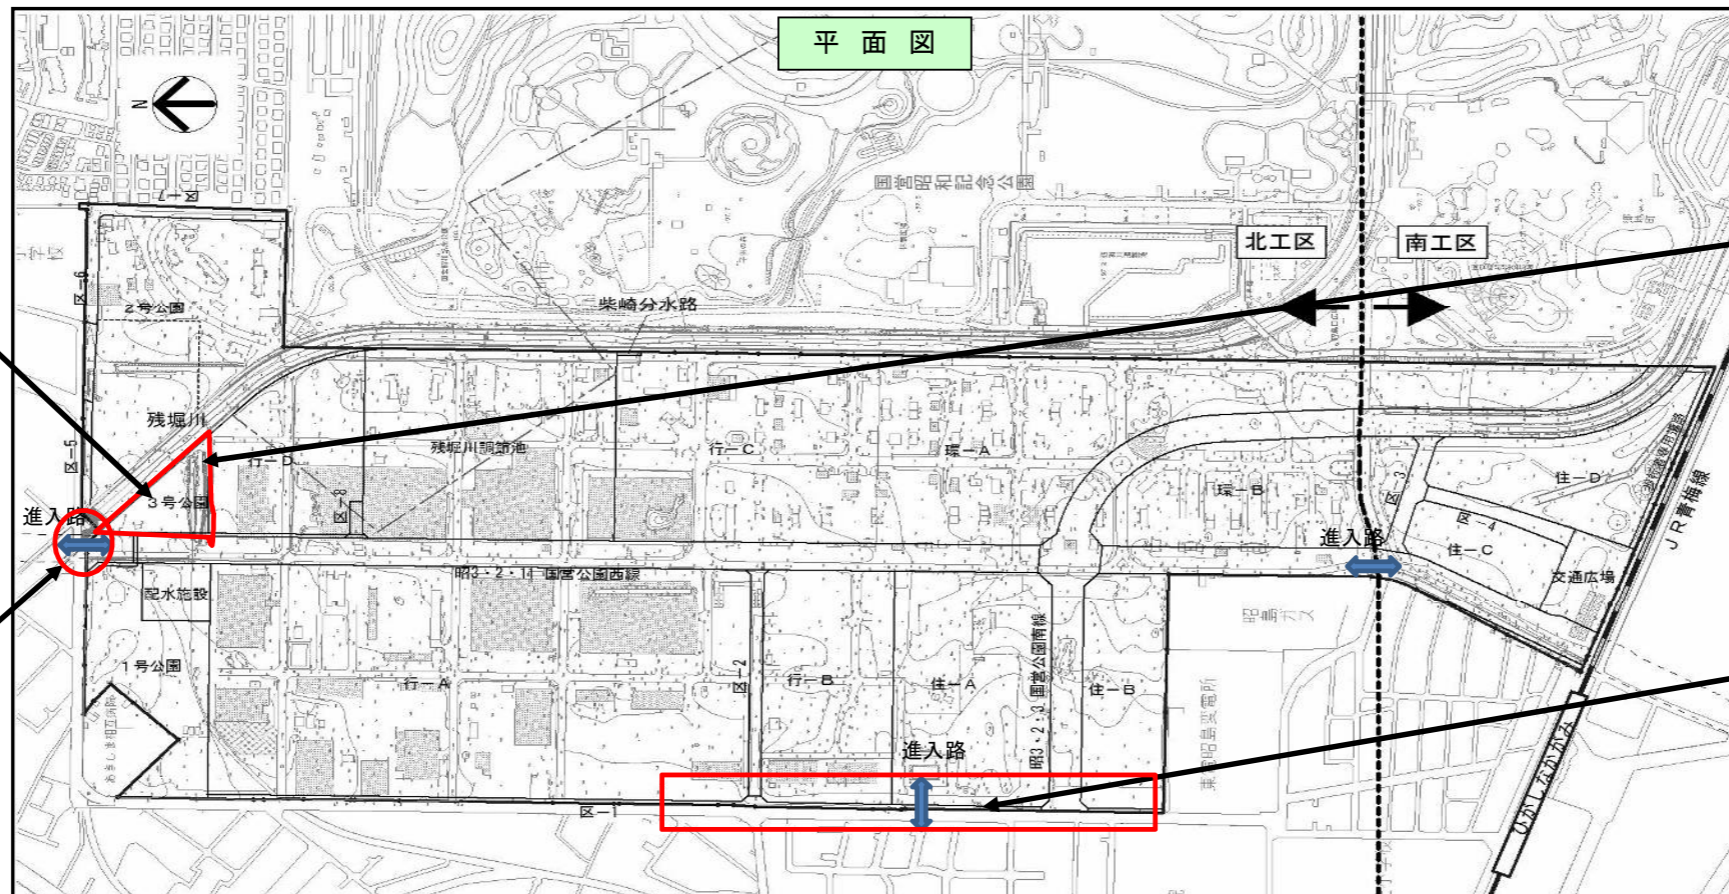

廃線遺構整備状況



富士見通り整備状況

