

工程表


工事名: 立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事他1件

鴻池・岩倉建設工事共同企業体

工事名: 立川基地跡地昭島地区2号公園他整備工事 (現場だよりはこちら→ <http://www.seibu-la.co.jp/tachikawaakishima/blog/>)

西武造園株式会社

種別	細別	平成29年3月																															備考			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金				
園路広場整備工	インターロッキング舗装、園路縁石				●	●																														
敷地造成工					●	●																														
植栽工	低木・地被類・張芝				●	●																														
電気・給水設備工					●	●																														
残堀川遊歩道	仮囲い、舗装撤去・復旧、電線管撤去				●	●																														
仕上げ・片付け																																				
仮設工	仮橋周辺整備				●	●																														
備考					休工日																															

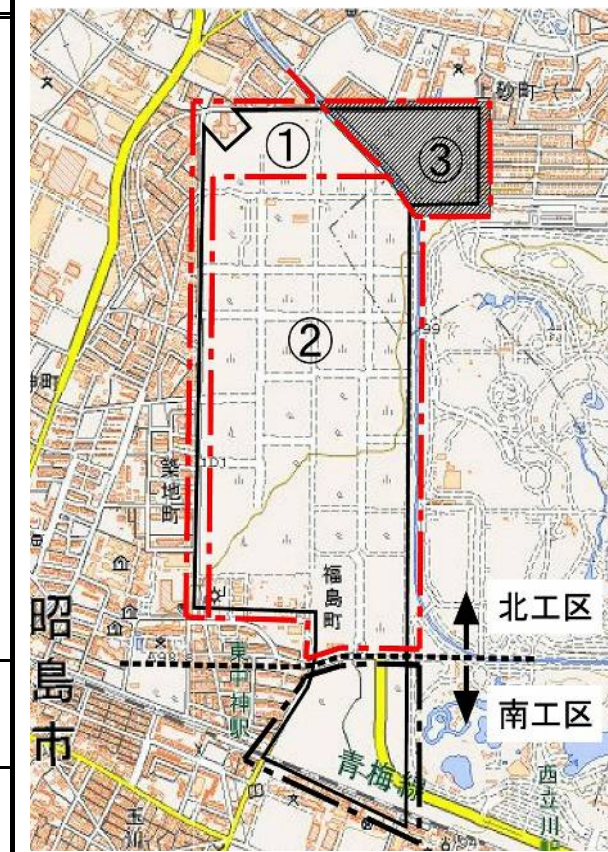


2月25日時点 進捗状況

複合遊具(完了)



張芝(完了)

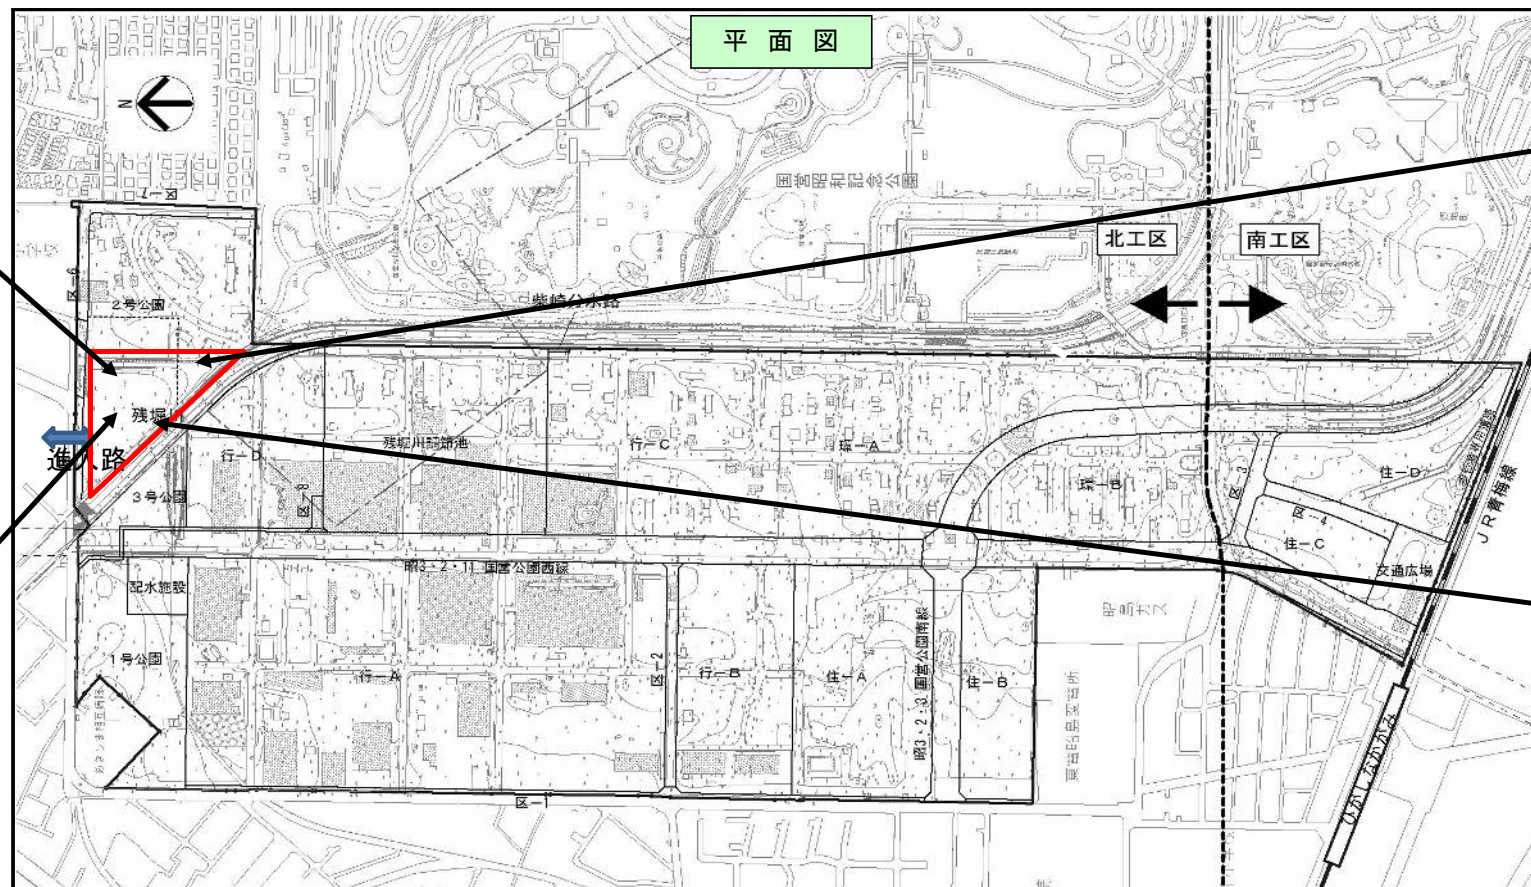

舗装・張芝(完了)



ベンチ・植栽(完了)

