


工程表

工事名: 立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事他1件

鴻池・岩倉建設工事共同企業体

種別	細別	平成29年3月																															備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
《南工区》																																	
舗装工事	車道舗装工																																区-4
道路・舗装工事	平板ブロック工 車道舗装工																																交通広場
整地工	法面、防災施設工																																住-C・D
機械設備工事																																	交通広場
植栽工																																	交通広場、 区-3, 4
電気設備工事																																	交通広場
備考																																	

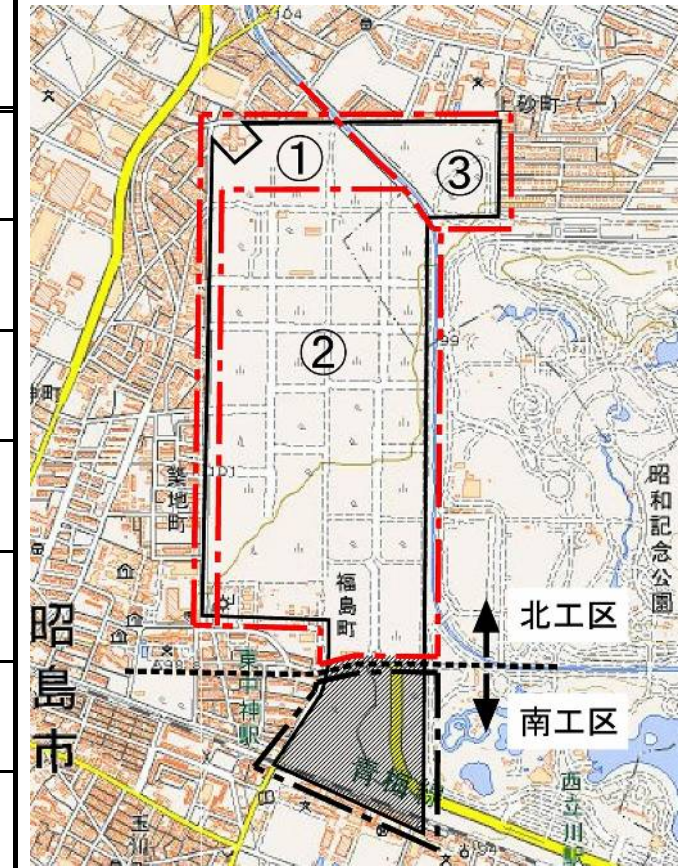

2月25日 時点 進捗状況

