

工程表


工事名:立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事他1件

鴻池・岩倉建設工事共同企業体

工事名:立川基地跡地昭島地区2号公園他整備工事(現場だよりはこちら→ <http://www.seibu-la.co.jp/tachikawaakishima/blog/>)

西武造園株式会社

種別	細別	平成29年2月																												備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
園路広場整備工	透水性コンクリート舗装 インターロッキング舗装 園路縁石・階段				●	●							●	●						●	●					●	●			
敷地造成工	小堤 法面整形				●	●							●	●						●	●					●	●			
植栽工	高中低木 地被類・張芝				●	●							●	●			●	●			●	●				●	●			
石工事	石組・景石 縁石工				●	●							●	●						●	●					●	●			
電気設備工	照明設備工 電線管路工				●	●							●	●						●	●					●	●			
道路・舗装工事	車道・歩道				●	●							●	●						●	●			●						
歩道工事	インターロッキング 電気設備工 植栽工				●	●							●	●						●	●					●	●			
備考					● 休工日																									

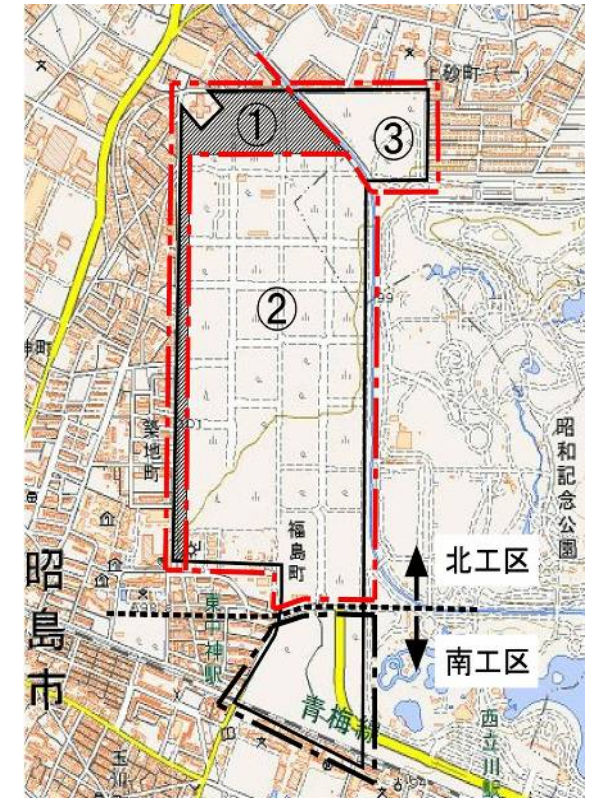


1月25日時点 進捗状況

コンクリートウォール階段施工(完了)



廃線遺構施工状況

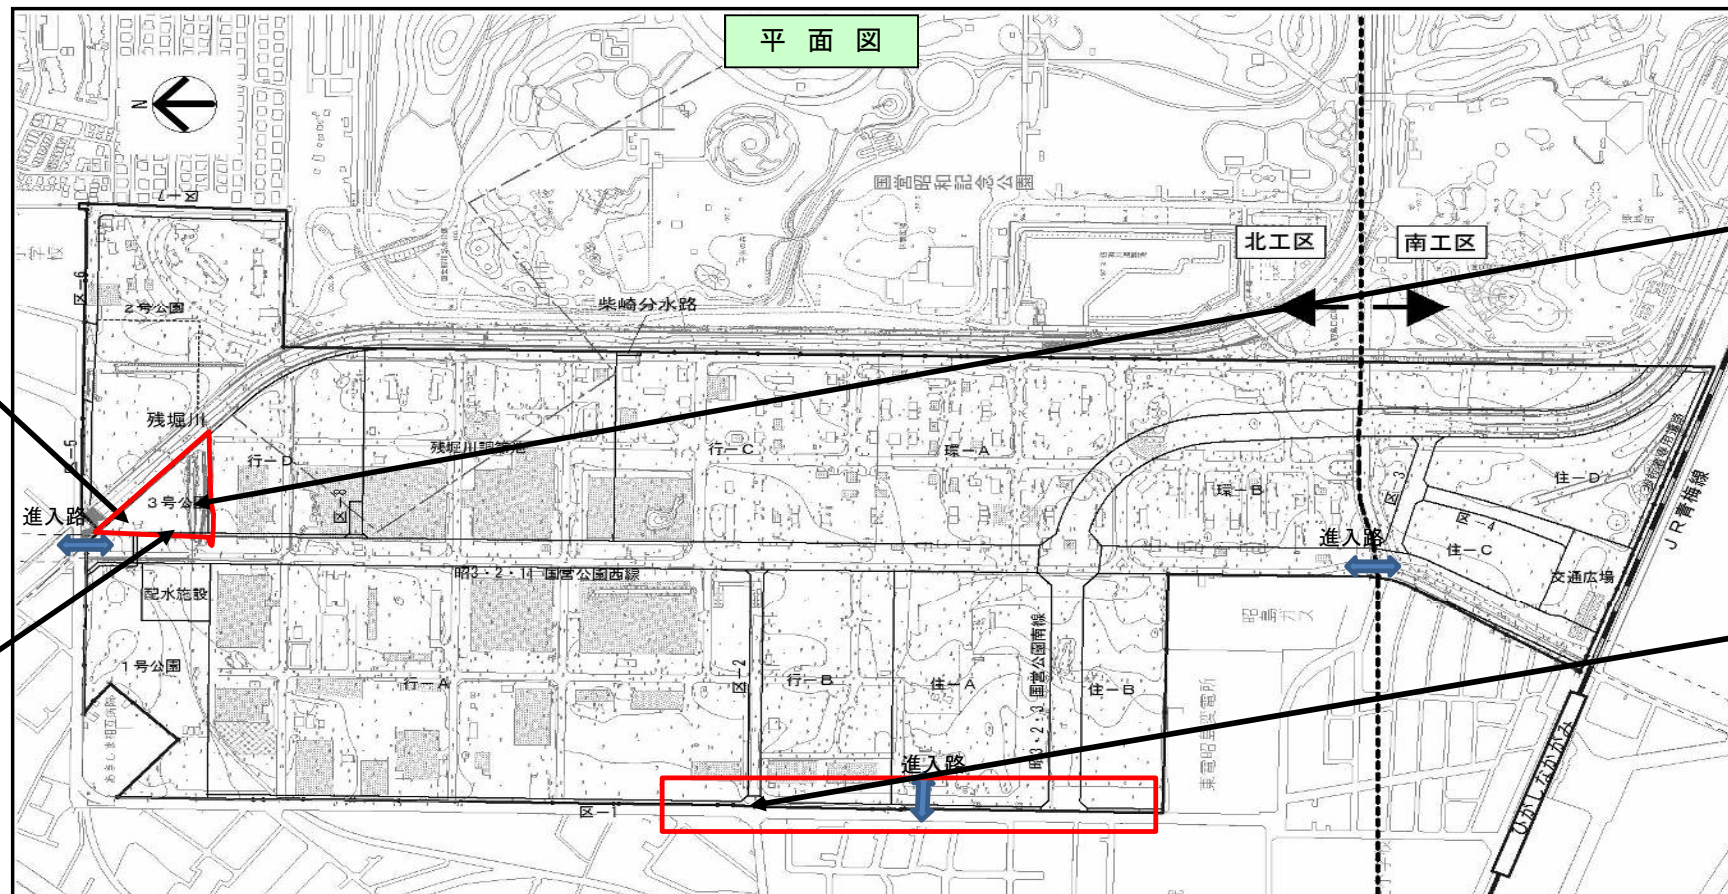

ベンチウォール完了・舗装施工状況



交差点工事(完了)

