

工程表


工事名: 立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事

鴻池・岩倉建設工事共同企業体

工事名: 立川基地跡地昭島地区2号公園他整備工事 (現場だよりはこちら→ <http://www.seibu-la.co.jp/tachikawaakishima/blog/>)

西武造園株式会社

種別	細別	平成29年2月																												備考			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火				
園路広場整備工	透水性コンクリート舗装 インターロッキング舗装 園路縁石・階段				●	●						●	●							●	●						●	●					
植栽工	高中低木 地被類・張芝				●	●						●	●							●	●						●	●					
サービス施設工 管理施設工	ベンチ・サイン 車止め				●	●						●	●							●	●												
電気設備工	照明設備工 電線管路工				●	●						●	●							●	●												
残堀川遊歩道	仮囲い、舗装撤去・ 復旧、電線管撤去		●	●	●							●	●							●	●						●	●					
仮設工	仮橋周辺整備		●	●	●							●	●							●	●												
備考					休工日																												

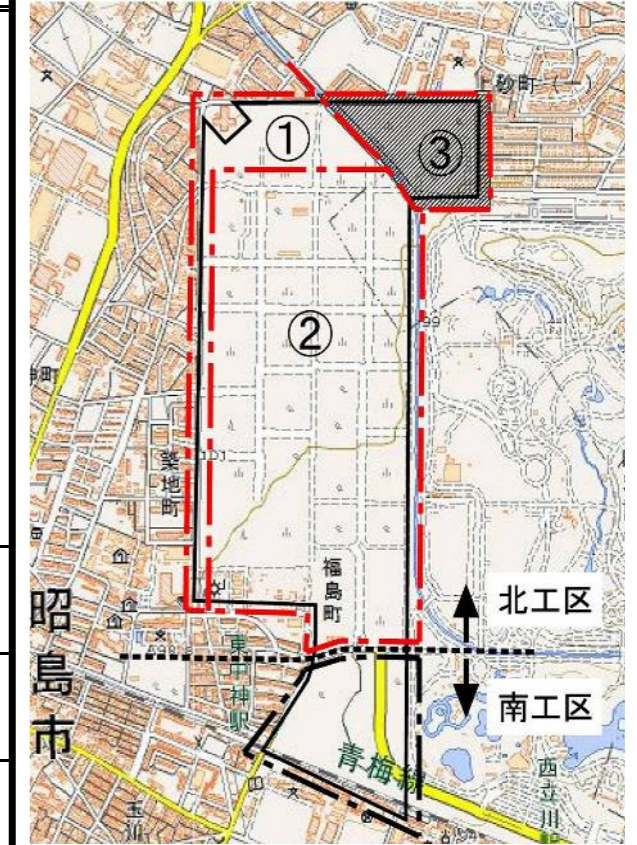


1月25日時点 進捗状況

複合遊具設置完了



透水性コンクリート舗装完了

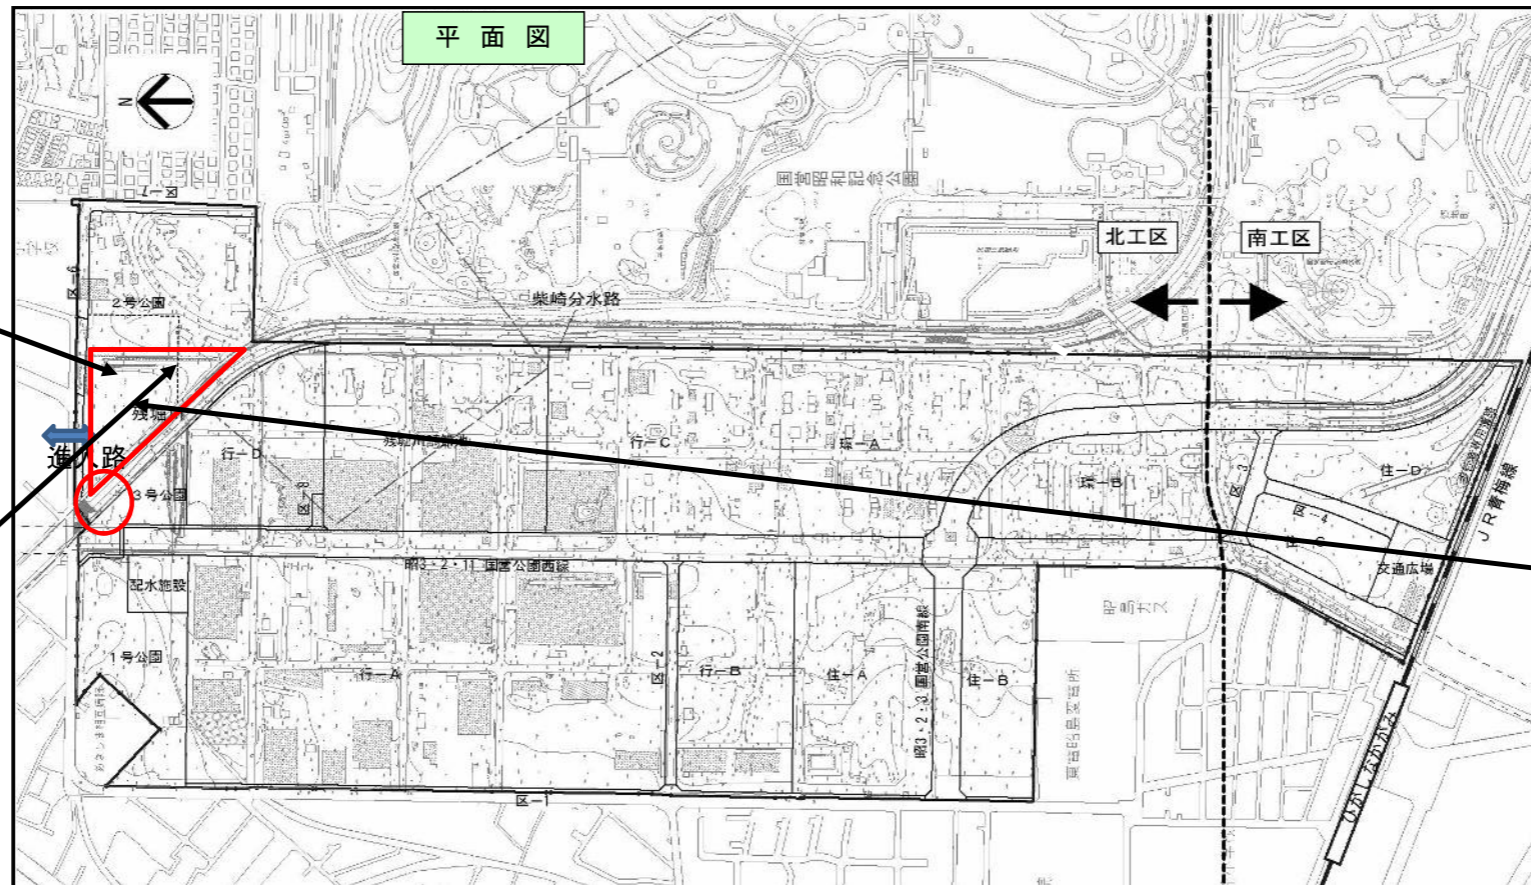

舗装・健康遊具完了

