


# 工程表


工事名: 立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事他1件

鴻池・岩倉建設工事共同企業体

種別	細別	平成29年 1月																															備考		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
「北工区②」 仮設工	敷鉄板撤去																																		
準備工	測量																																		
整地工事	掘削工、盛土工 法面工																																		
道路・舗装工事	区画線工																																		南線
植栽工事	吹付																																		
備考		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <span>休日</span> </div>																																	

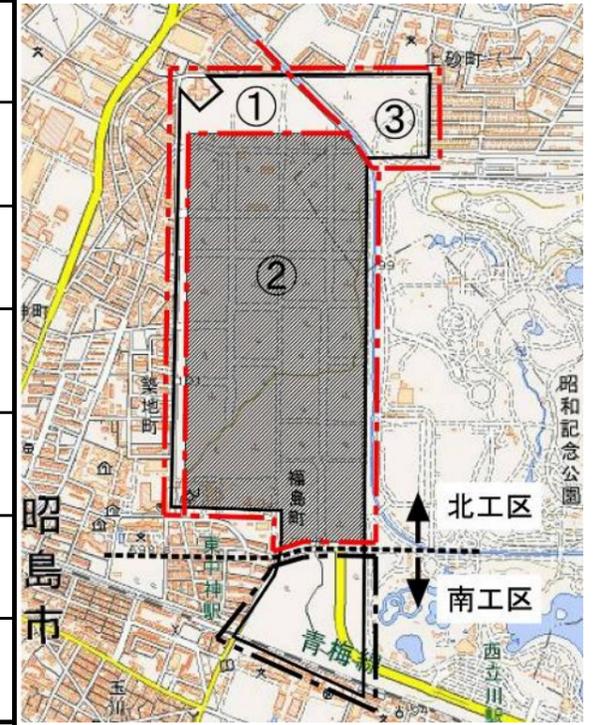

12月25日 時点  
進捗状況

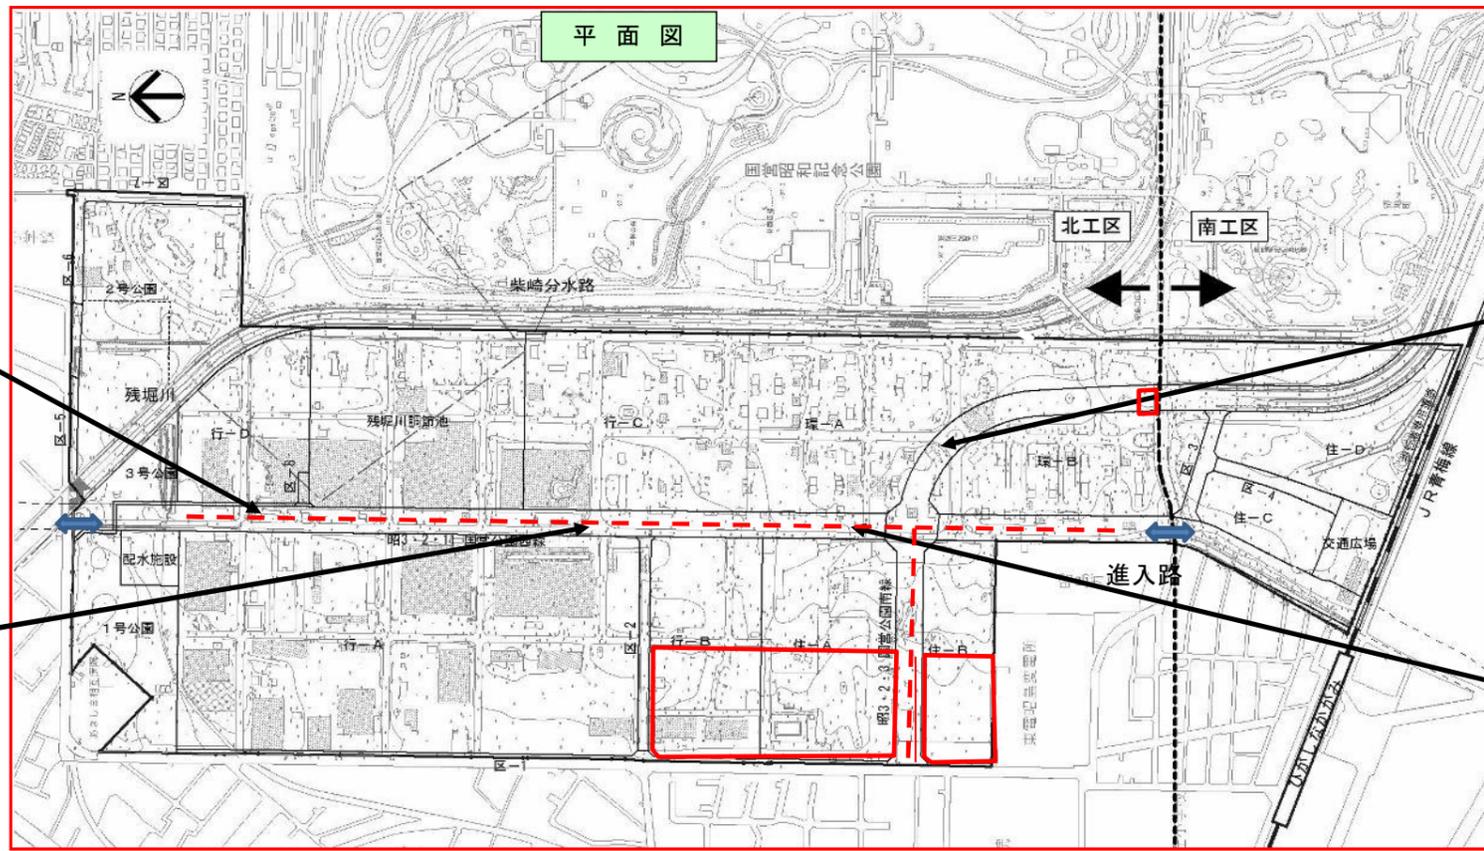

西線 車道舗装



西線 車道舗装



南線 車道舗装 (As安定処理)



西線 車道舗装

