


工程表

工事名: 立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事他1件

鴻池・岩倉建設工事共同企業体

種別	細別	平成29年 1月																															備考		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
「南工区」 交差点工事																																	区-3		
道路・舗装工事	路面排水工 道路土工																																	区-4	
電気設備工事																																		交通広場	
整地工	法面、防災施設工																																	住-C・D	
建築工事	シェルター工事																																	交通広場	
備考																																		休工日	

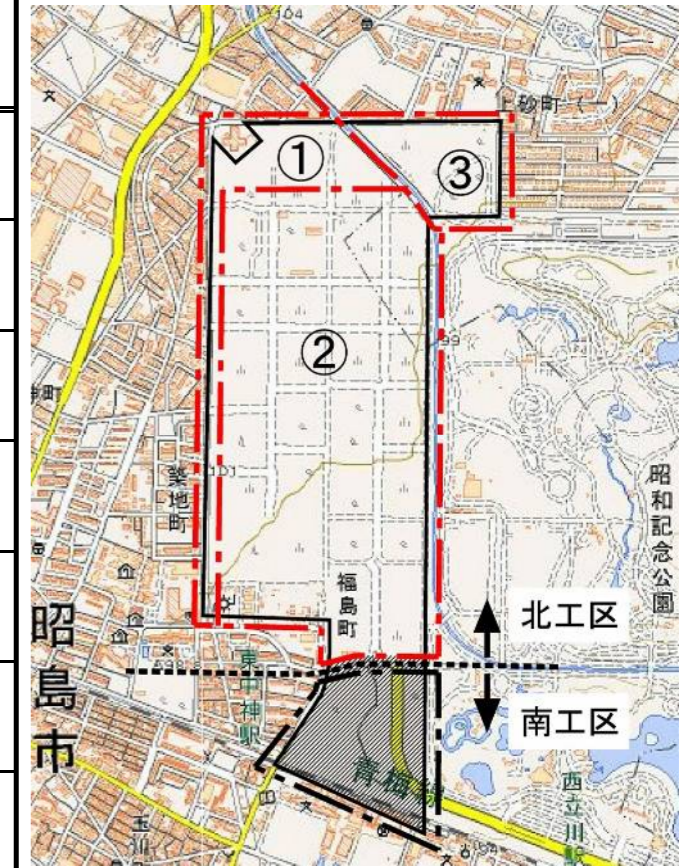

12月25日 時点
進捗状況

