

工程表


工事名:立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事

鴻池・岩倉建設工事共同企業体

工事名:立川基地跡地昭島地区2号公園他整備工事


西武造園株式会社

種別	細別	平成28年 10月																															備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
敷地造成工	掘削・盛土	●	●	●					●		●																						
雨水排水設備工	集水樹・管渠・地下排水	●	●	●					●		●																						
園路広場整備工	舗装路床・路盤																																
電気設備工	電線管路・ハンドホール・照明設備基礎																																
残堀川沿い	撤去工・縁石工																																
道路施設工	バス停移設 信号配管工																																
仮設工																																	
備考																																	

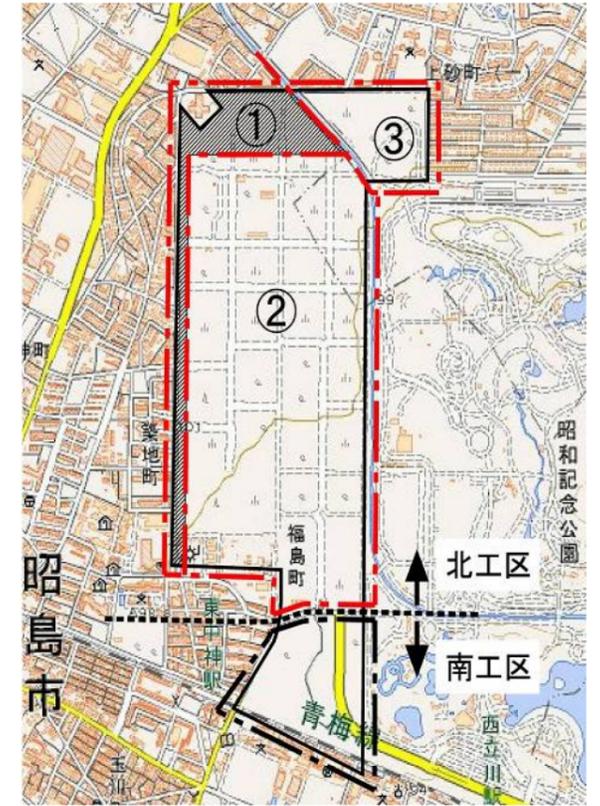

9月25日時点進捗状況

浸透施設施工状況

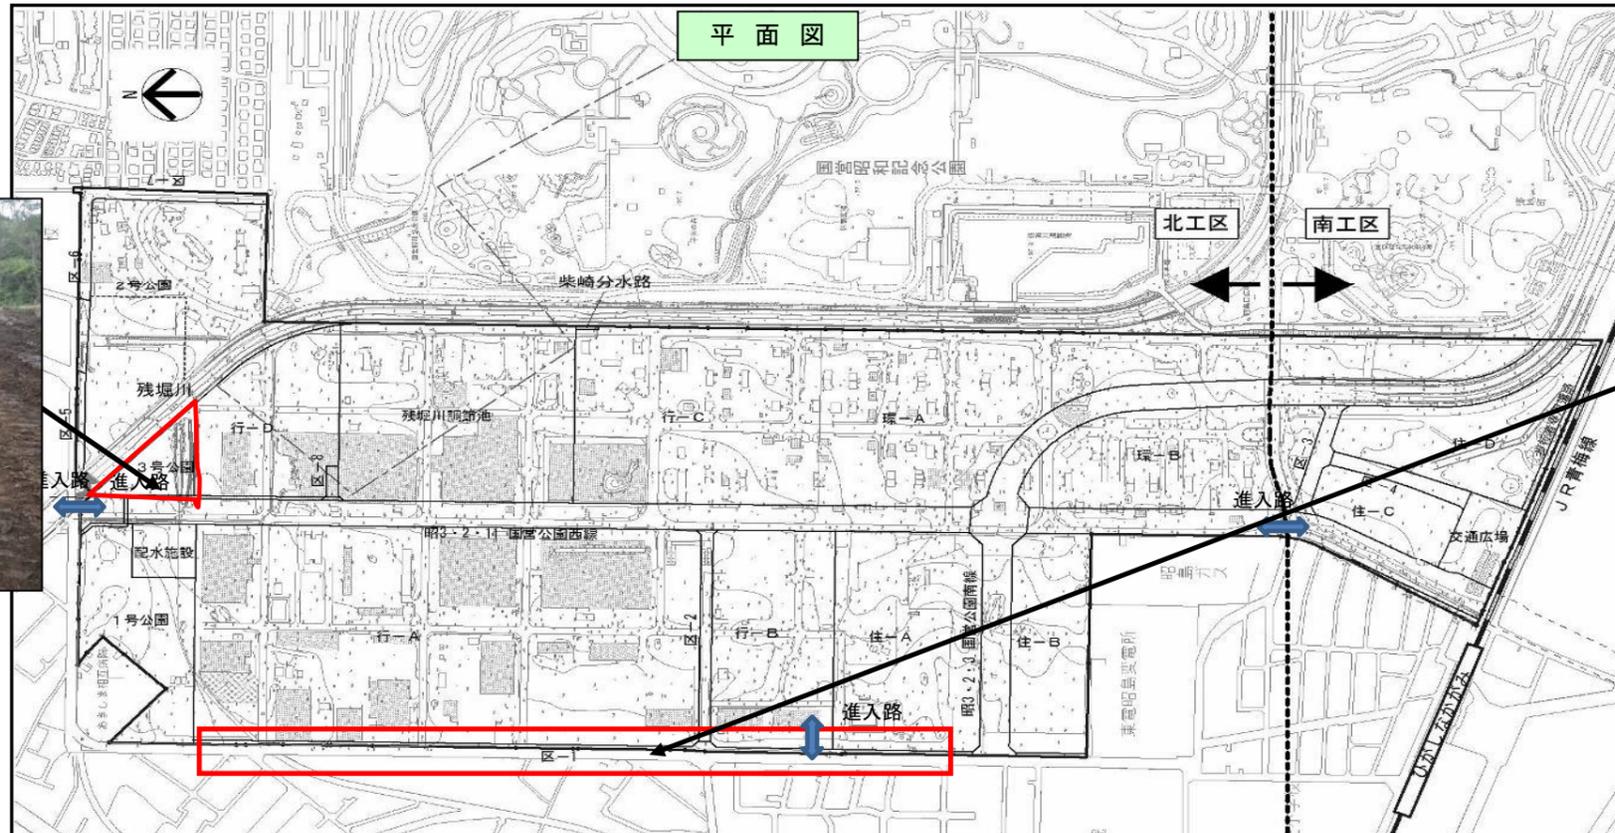

乗入部設置完了

