


# 工程表

工事名: 立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事他3件

鴻池・岩倉建設工事共同企業体

種別	細別	平成28年 6月																														備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
「北工区③」 仮設工・撤去工	構造物撤去																															区-7
排水工事	道路排水管工																															区-5,区-6
道路工事	路面排水工																															区-7,区-5
舗装工事	路盤工・舗装工																															区-7
備考																															休工日	

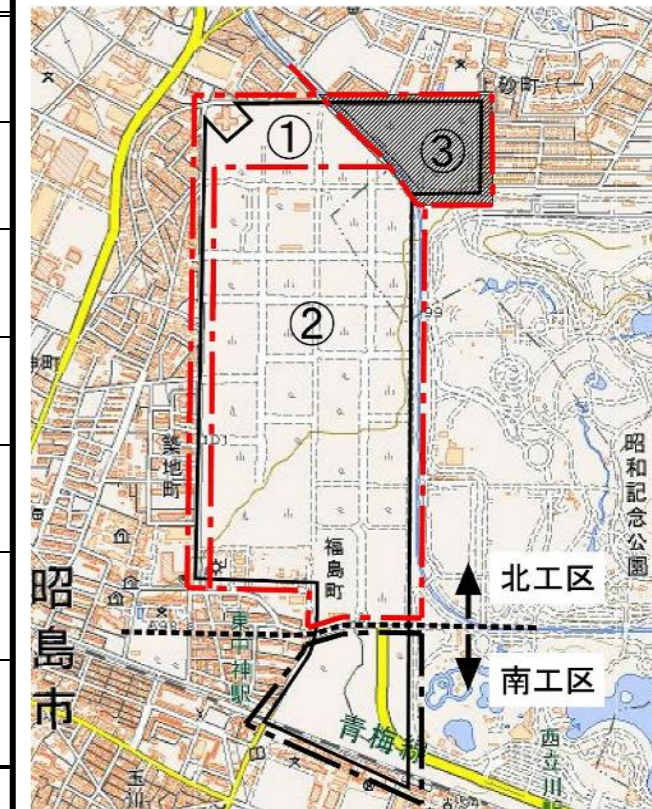

5月25日 時点  
進捗状況

路面排水・路盤完了

