

工程表


工事名:立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事

鴻池・岩倉建設工事共同企業体

工事名:立川基地跡地昭島地区1号公園整備工事

株式会社 日比谷アメニス

種別	細別	平成28年 4月																														備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
排水設備工	雨水管・污水管																															
施設工	遊戯施設・管理施設																															
園路広場整備工	縁石・舗装																															
植栽工	高木・中木・低木																															
整地工	防火水槽設置																															
道路舗装工	歩道整備																															
	照明柱基礎設置																															
備考		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; margin-right: 5px;"></div> 休日 </div>																														

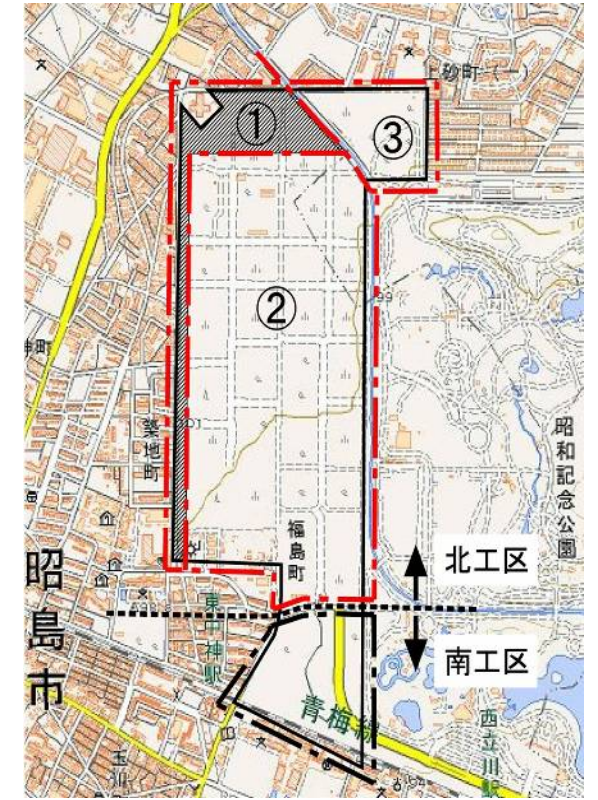

サークルベンチ設置



境石設置状況



3月25日 時点
進捗状況

シェルター設置



縁台設置・舗装敷設

