

工程表

工事名:立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事

鴻池・岩倉建設工事共同企業体


作業箇所	種別	細別	平成29年4月																														備考
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
北工区	住 A	《北工区②》 調査等		●						●	●						●	●						●									
	各交差点	仮設工		●						●	●																						
南工区	付帯地	仮設工		●						●	●						●																
	付帯地	付帯工																													●		
	各交差点	仮設工		●						●	●																						
備考			<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 休工日 </div>																														

3月25日時点 進捗状況

区-5号線 (完成)



区-2号線 (完成)

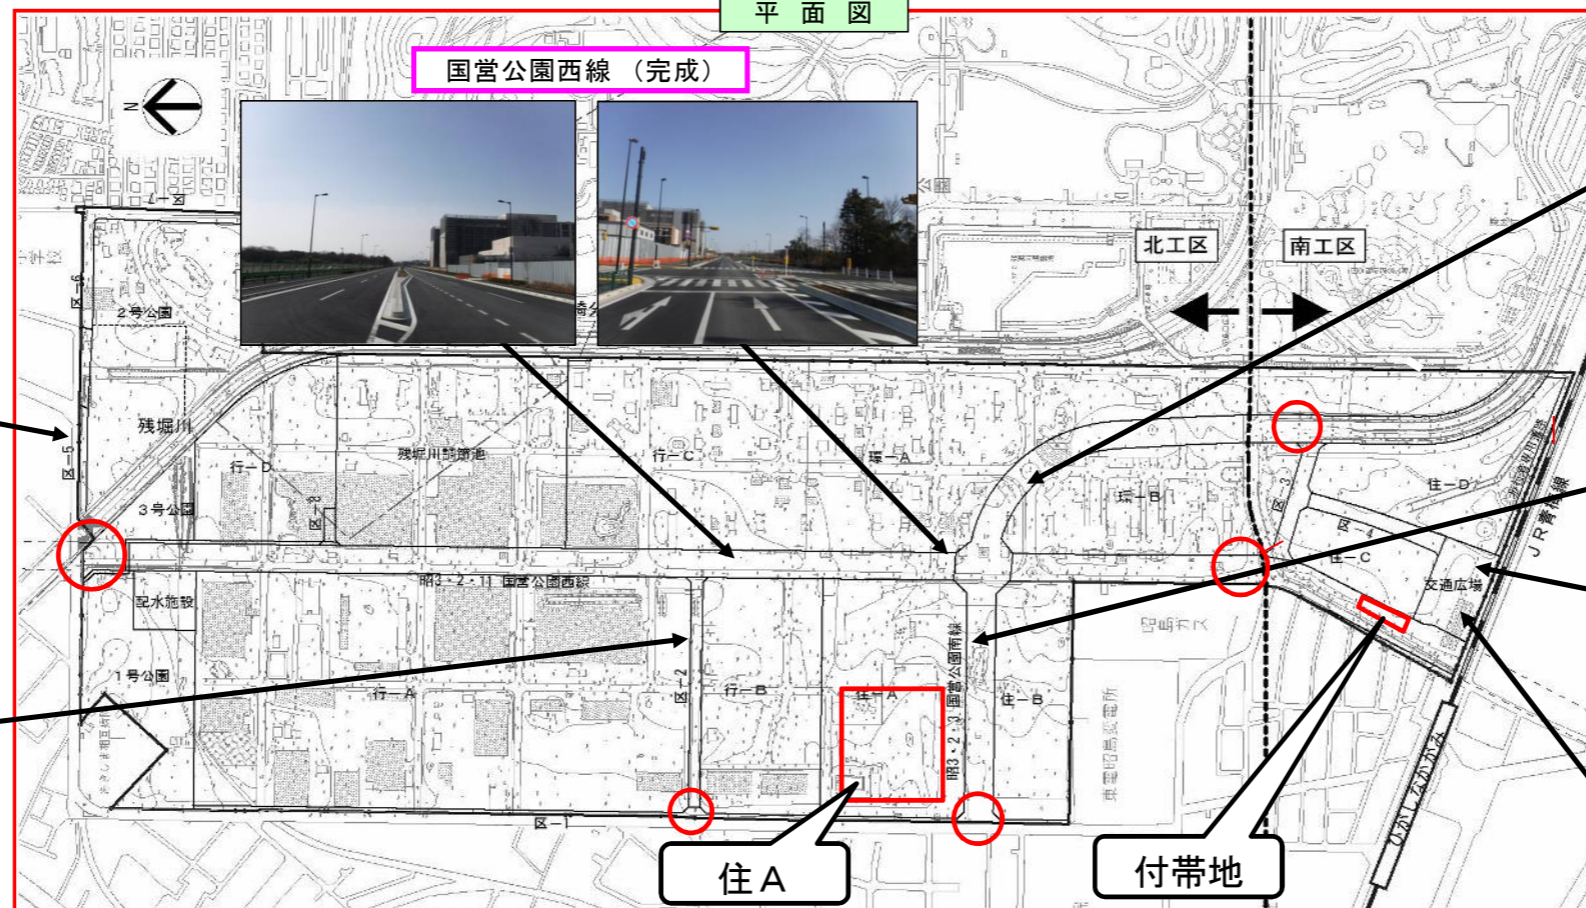

国営公園南線(完成)



交通広場(完成)



○ : 交差点作業箇所
