


工 程 表

工事名: 立川基地跡地昭島地区平成26年度公共下水道工事他2件

佐田建設株式会社

種 別	細 別	平成26年 12月																															備 考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
《北工区》 排水工	雨水本管工	Aブロック						A、Dブロック						全箇所仕上、インバート、管清掃																			
	汚水本管工	Fブロック						Dブロック						全箇所仕上、インバート、管清掃																			
道路工	側溝工	A、B、C、Eブロック						A、Cブロック																									
	中央分離帯	A、B、C、Eブロック						A、Cブロック						埋戻し																			
舗装工	歩道土工	A、B、C、Eブロック																															
	車道路盤工	A、B、C、Eブロック																															
	車道舗装工							A、Eブロック						Bブロック						Cブロック													
(昭和記念公園内)	カルバート工																																
	護岸、吐口工																																
《南工区》 排水工	雨水本管工																																
道路・舗装工	側溝工																																
備 考																																	休工

11月21日 時点
進捗状況

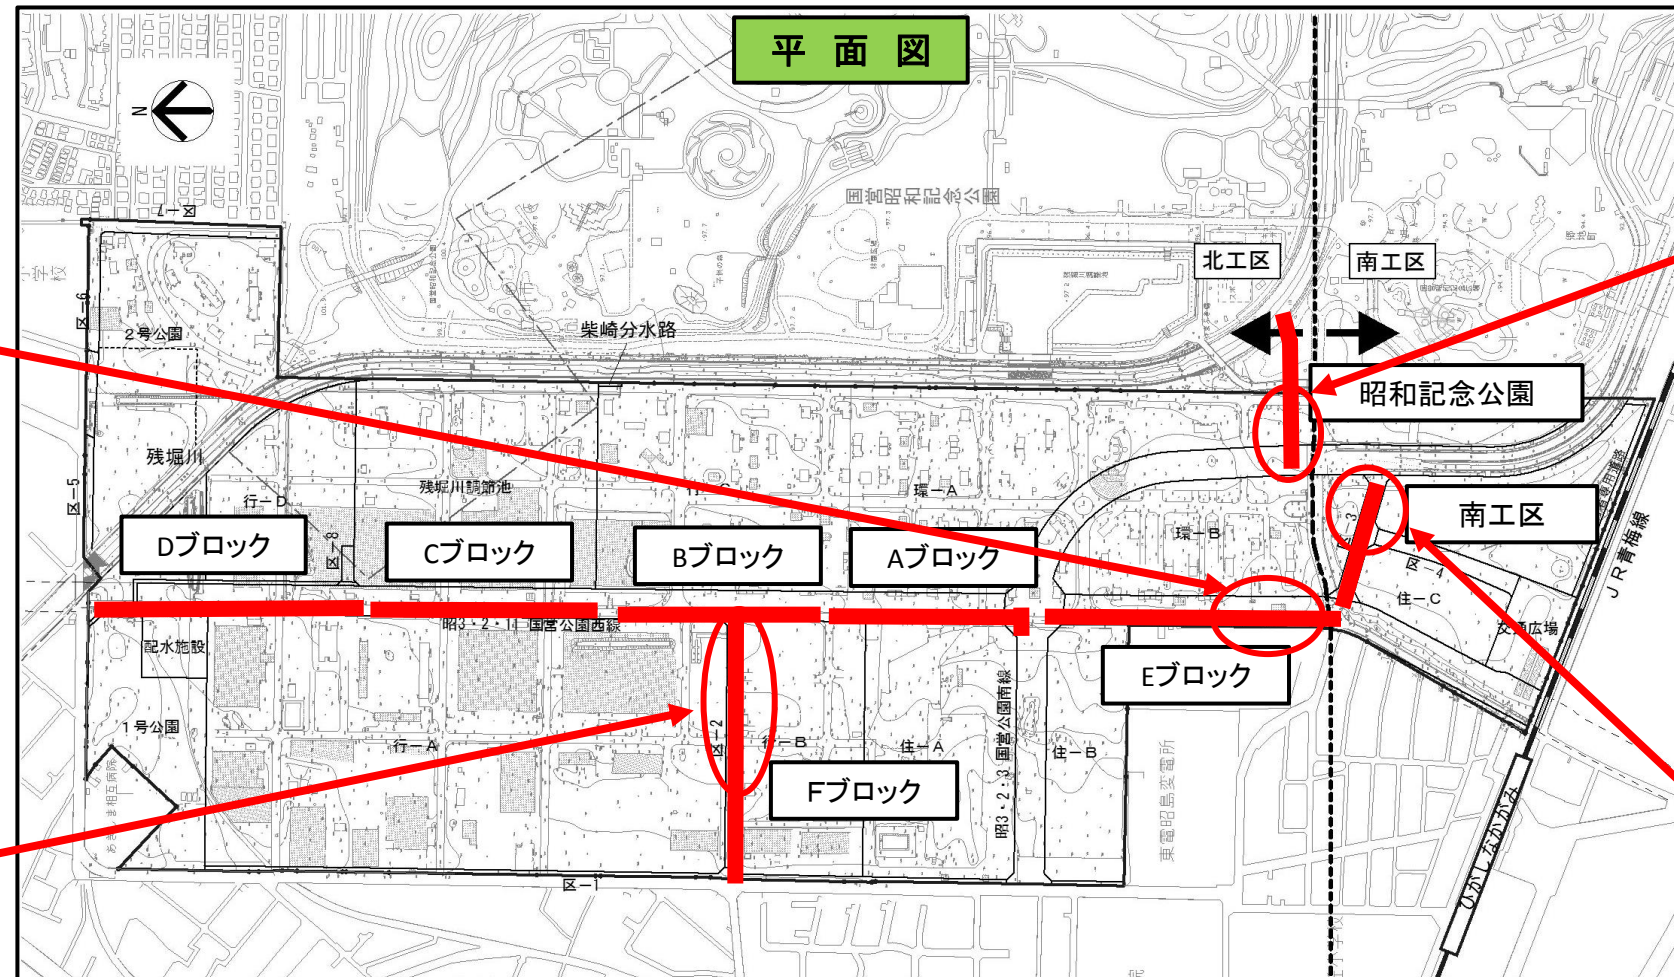

道路工施工状況



雨水本管工施工状況



西側ボックスカルバート完了



雨水本管工施工状況
