



まちづくりニュース (花月園競輪場跡地)



令和4年4月20日

発行：横浜市 環境創造局、都市整備局
UR都市機構 東日本都市再生本部

事業進捗状況について

日頃から本事業に対するご理解、ご協力をいただきありがとうございます。22号でお知らせした12m道路始点部等の工事を引き続き行うとともに、新たにスロープ新設工事に着手します。地域の皆様には、ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

スロープ新設工事について

22号でご案内したスロープ架け替えに関連する工事について、スロープ閉鎖期間を短くできるよう工程を見直し、5月上旬に着手する予定です。7月上旬からは、既存スロープ解体工事に着手するため、スロープは閉鎖します。閉鎖期間中は、お手数ですが跨線橋に設置のエレベーター・階段をご利用いただき、迂回にご協力をお願いします。



新設スロープの一般開放は、都市計画法の手続により開発事業の工事完了公告(令和5年3月頃)後を予定していますが、スロープ完成後なるべく早く通行ができるよう引き続き調整を進めていきますので、ご理解よろしくお願いいたします。

5月上旬～6月末通行計画

スロープ架け替え関連工事工程表(予定)


	2022年								2023年		
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備・山留橋台工事	▶		5月中旬に2日程度、工事仮囲い等の変更の作業を行います。このため、通行できない時間帯が生じますが、ガードマンによる迂回誘導を行います。								
スロープ自転車駐車場等工事	▶ スロープ通行不可期間										

※工期につきましては諸官庁との協議や天候により変更となる場合がございます

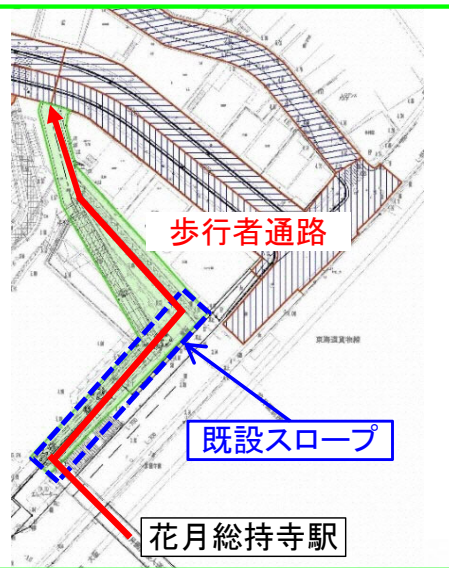

7月以降迂回路計画

※工事時間中(昼間)の区画エリア。夜間は歩道を通行できるようにします。

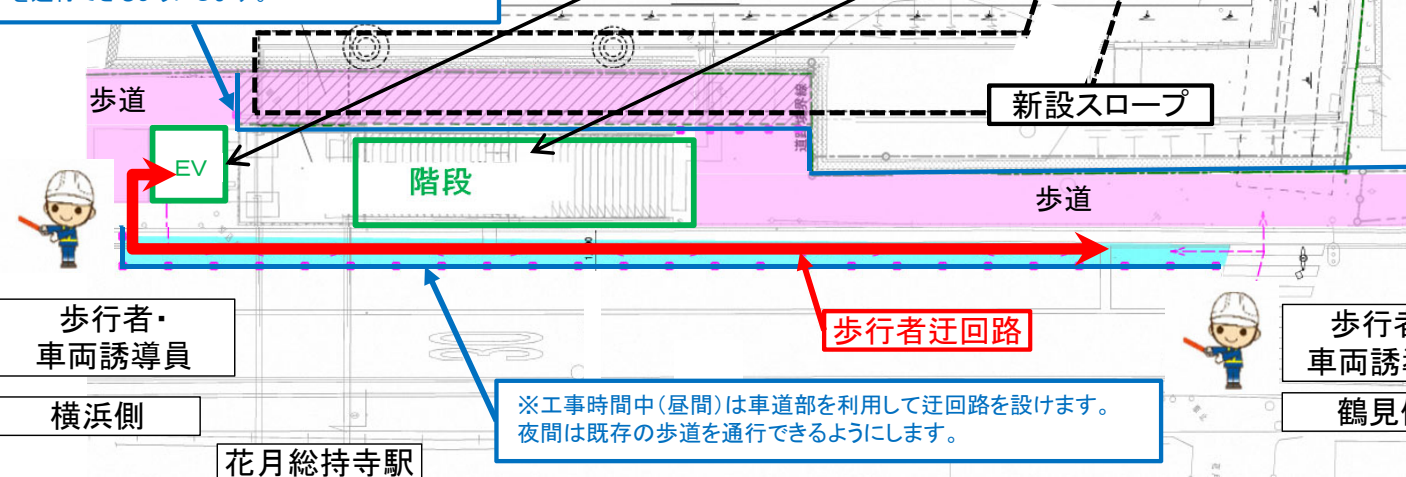

※工事時間中(昼間)は車道部を利用して迂回路を設けます。夜間は既存の歩道を通行できるようにします。

工事の状況について

12m道路始点部の工事など、お住まいに近く、日頃通行される部分での工事が多くっており、地域の皆様には、振動や音を含めご不便、ご迷惑をおかけしています。安全第一で早期完成を目指して進めてまいりますので、ご理解、ご協力の程よろしく申し上げます。



事業全体スケジュール(予定)

2021 令和3年度	2022 令和4年度	2023 令和5年度	2024 令和6年度	2025 令和7年度
■鶴見花月園公園（令和3年11月1日開園）				
12m道路				
宅地		集合住宅建設工事		
	北側道路			
	スロープ・自転車駐車場			

※スケジュールは整備予定を表しています。詳細は横浜市及びUR都市機構で調整し、改めてご案内します。

鶴見一丁目地区の状況はこちらでもご覧になれます
⇒<http://www.ur-net.go.jp/tsurumi>

（鶴見花月園公園の整備内容等について）

■横浜市環境創造局 公園緑地部 公園緑地整備課 電話 045-671-4611

（地区全体のまちづくりの考え方について）

■横浜市都市整備局 地域まちづくり部 地域まちづくり課 電話 045-671-2667

（地区全体の整備内容や事業スケジュール等について）

■UR都市機構 東日本都市再生本部

（計画関連）事業推進部 事業推進第2課 電話 03-5323-0678

（工事関連）基盤整備計画部 基盤統括課 電話 03-5323-0848

（工事について）

（UR工事）UR鶴見一丁目地区工事監督員事務所 電話 0120-454-081 電話 080-1036-0238

（民間JV工事）花月園造成作業所 電話 045-717-9802

（スロープ工事について）

■大末建設(株)東京本店 工事部 電話 03-5634-9101
