工 程 表

工事名：立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事他3件

鴻池・岩倉建設工事共同企業体

種 別	細 別	平成28年 2月																													備 考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
≪北工区③≫ 仮設工	仮囲工												●	―	●								●	―	―	―	―	―	●	●	―	●	
整地土工	掘削工												●	―	●	●	―	―	―	―	●											
撤去工	構造物撤去工																								●	―	―	●	●	―	●	区-7
備 考		休工日																														

北工区③区域

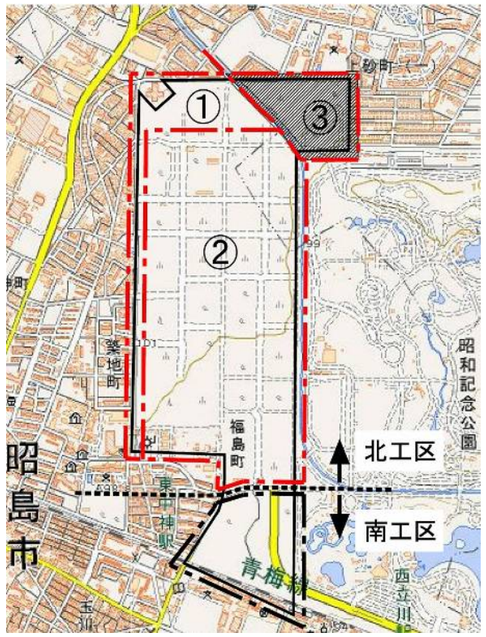

1月25日 時点
進 捗 状 況

フェンス設置完了

歩道部除雪状況
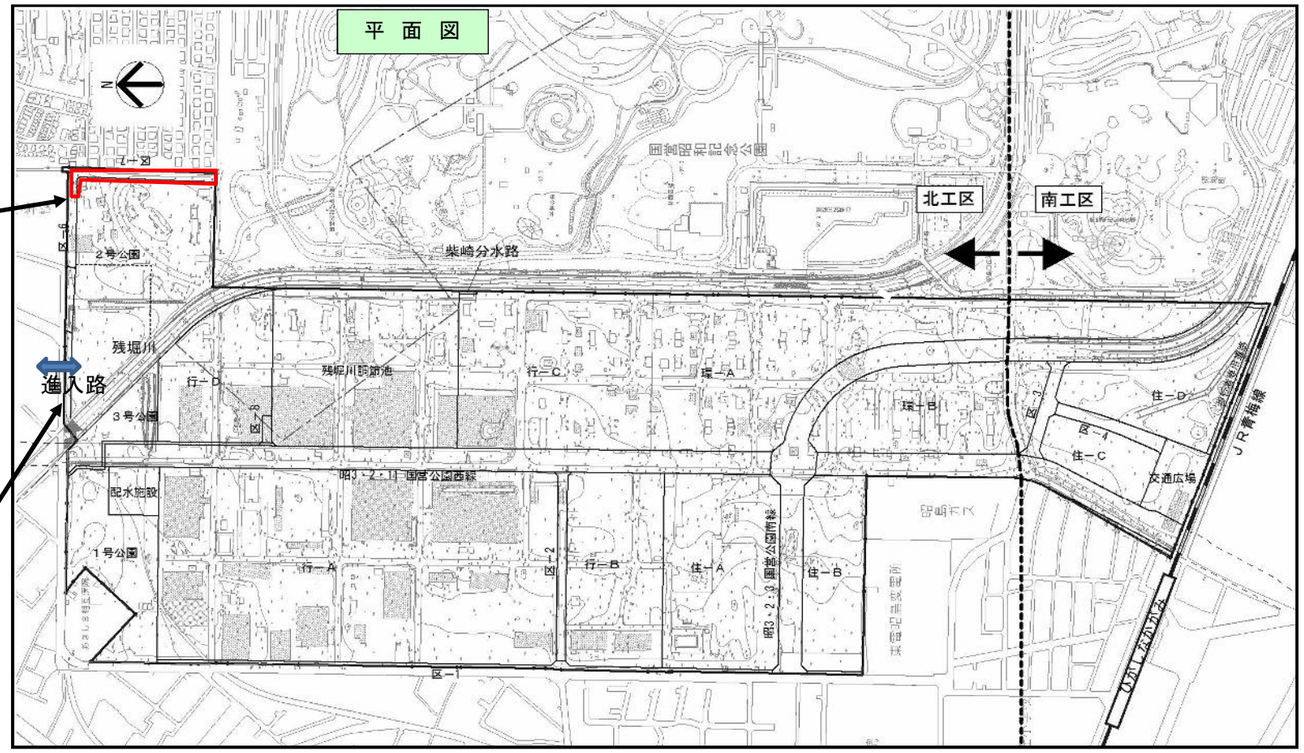
平 面 図
