北工区　①区域　工　程　表（4～5月）

工事名：立川基地跡地昭島地区国営公園南線外道路その他工事他1件

鴻池・岩倉建設工事共同企業体

種　別	細　別	平成27年4月										平成27年5月																							備　考
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
進入路工事	出入口設置工																																									
	鉄板敷設工																																									
撤去工事	伐採工																																									
	構造物撤去工																																									
排水工事	準備工(調査、測量)																																									
	雨水本管工																																									
備　考		休工日																																								

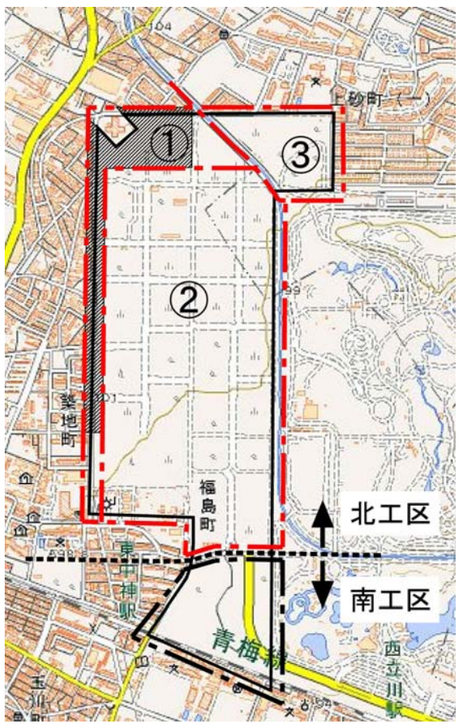

4月15日　時点
進　捗　状　況

進入路付近（北側）

撤去工（着手前）

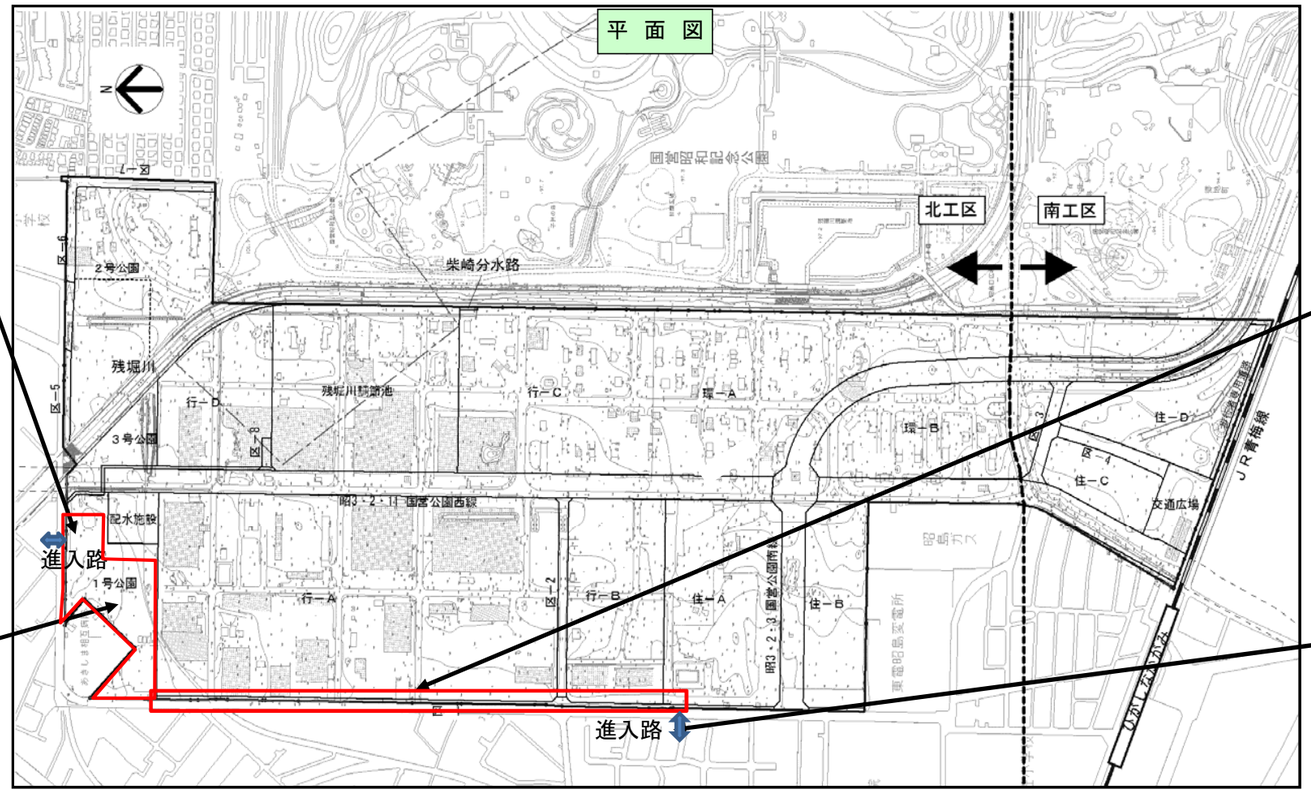

排水工事（着手前）

進入路付近（西側）
